

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2019-324-II
Дана: 22. новембра 2019. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 79. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма спровођења мера техничке заштите објеката у саставу просторно културно-историјске целине Горња и доња Тврђава са подграђем у Петроварадину, са Образложењем и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 6-3/2019-324-II од 22. новембра 2019. године, с молбом да се дневни ред LVII седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 27. новембар 2019. године, допуни разматрањем Извештаја о реализацији Програма спровођења мера техничке заштите објеката у саставу просторно културно-историјске целине Горња и доња Тврђава са подграђем у Петроварадину, и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту, имајући у виду рок за извештавање прописан наведеним Програмом.



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско веће Града Новог Сада на 281. седници од 22.11. 2019. године, поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма спровођења мера техничке заштите објеката у саставу просторно културно-историјске целине Горња и доња Тврђава са подграђем у Петроварадину, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 79. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се Извештај о реализацији Програма спровођења мера техничке заштите објеката у саставу просторно културно-историјске целине Горња и доња Тврђава са подграђем у Петроварадину, који је Управни одбор Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад усвојио на 52. седници од 15. новембра 2019. године, председнику Скупштине Града Новог Сада и предлаже Скупштини Града Новог Сада да Извештај размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај о реализацији Програма спровођења мера техничке заштите објеката у саставу просторно културно-историјске целине Горња и доња Тврђава са подграђем у Петроварадину.“

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Далибор Рожић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зорица Шијак, в.д. начелника Градске управе за културу.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2019-324-II
Дана: 22.11.2019. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Програма спровођења мера техничке заштите објеката у саставу просторно културно-историјске целине Горња и доња Тврђава са подграђем у Петроварадину, садржан је у члану 39. тачка 55. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано да Скупштина Града Новог Сада разматра и усваја извештаје о реализацији планова и програма.

Тачком VI Програма прописано је да ће Извештај о реализацији програма и коришћењу одобрених средстава, Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад сачинити у року од 30 дана по реализацији активности из Програма и доставити Скупштини Града Новог Сада.

Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада доставио је Градској управи за културу:

- Извештај о реализацији Програма спровођења мера техничке заштите објеката у саставу просторно културно-историјске целине Горња и доња Тврђава са подграђем у Петроварадину и
- Одлуку Управног одбора са 52. седнице од 15. новембра 2019. године.

Према Извештају Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада о реализацији Програма спровођења мера техничке заштите објеката у саставу просторно културно-историјске целине Горња и доња Тврђава са подграђем у Петроварадину, који је усвојила Скупштина Града Новог Сада на XVII седници одржаној 23. марта 2017. године, радови су обухватили обнову фасада на 21 објекту из Програма, која је реализована по фазама I, II, III и IV. Завод је у целости реализовао планиране активности на објектима:

1. Објекат у улици Београдска бр. 2, Петроварадин,
2. Објекат у улици Београдска бр. 4, Петроварадин,
3. Објекат у улици Београдска бр. 8, Петроварадин,
4. Трг Владике Николаја бр. 1, Петроварадин,
5. Трг Владике Николаја бр. 3, Петроварадин,
6. Објекат у улици Лисинског бр. 2, Петроварадин
7. Објекат у улици Београдска бр. 1, Петроварадин,
8. Објекат у улици Београдска бр. 3, Петроварадин,
9. Објекат у улици Београдска бр. 5, Петроварадин,
10. Објекат у улици Београдска бр. 7, Петроварадин,
11. Објекат у улици Београдска бр. 9, Петроварадин
12. Објекат у улици Београдска бр. 11, Петроварадин
13. Објекат у улици Београдска бр. 13, Петроварадин
14. Објекат у улици Београдска бр. 15, Петроварадин
15. Објекат у улици Београдска бр. 17, Петроварадин

16. Објекат у улици Београдска бр. 19, Петроварадин
17. Објекат у улици Лисинског бр. 1, Петроварадин
18. Објекат у улици Штросмајерова бр. 1, Петроварадин,
19. Објекат у улици Штросмајерова бр. 3, Петроварадин,
20. Објекат у Проте Михалцића бр.14, Петроварадин,
21. Објекат у улици Београдска бр. 23-25, Петроварадин

Укупно утрошена средства за реализацију радова на објектима утврђеним Програмом спровођења мера техничке заштите објеката у саставу просторно културно-историјске целине Горња и доња Тврђава са подграђем у Петроварадину, износе 96.900.123,96 динара.

Имајући у виду наведено, предлагемо да Скупштина Града Новог Сада размотри и усвоји Извештај о реализацији Програма спровођења мера техничке заштите објеката у саставу просторно културно-историјске целине Горња и доња Тврђава са подграђем у Петроварадину.



Град Нови Сад
Градски завод за заштиту споменика културе
Број: 2971
Датум: 15.11.2019

**УПРАВНИ ОДБОР
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА
НОВОГ САДА**

21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 22
Тел. 557 060, 557 061, тел./факс 456 166



Број: 201/52-2016
Нови Сад, 15.11.2019.

MM/BC

На основу члана 25. алинеја четрнаест Статута Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, бр. 89/2-2010 од 07. септембра 2010. године, 89/19-2010 од 30. октобра 2012. године, 89/21-2010 од 06. децембра 2016 и 89/27-2010 од 29. јануара, на 52. седници Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад, одржаној дана 15. новембра 2019. године, донета је следећа

ОДЛУКА

Усваја се Извештај о реализацији Програма спровођења мера техничке заштите објеката у саставу ПКИЦ Горња и доња тврђава са подграђем у Петроварадину, за 2017. годину, Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад.



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Петар Јаћимовић
Петар Јаћимовић

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ГРАДА НОВОГ САДА
21 000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 22
тел. 557-060/061



Број: 70/272-2017.
Датум: 30. 10. 2019. год
Нови Сад
СБ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ

Н О В И С А Д

ПРЕДМЕТ:	Извештај о реализацији Програма спровођења мера техничке заштите објеката у саставу просторно културно-историјске целине Горња и доња тврђава с подграђем у Петроварадину за 2017. годину
-----------------	---

У складу с тачком VI Програма спровођења мера техничке заштите објеката у саставу просторно културно-историјске целине Горња и доња тврђава с подграђем у Петроварадину, усвојеном на XVII седници Скупштине Града Новог Сада од 23. 03. 2017. године, Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада доставља следећи

ИЗВЕШТАЈ

Програм спровођења мера техничке заштите објеката у саставу просторно културно-историјске целине Горња и доња тврђава са подграђем у Петроварадину за 2017. годину, обухватио је радове на обнови фасада 21 објекта (Трг владике Николаја 1 и 3, Београдска 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23-25, Лисинског 1 и 2, Штросмајерова 1 и 3, Проте Михалчића 14).

Спровођење програма подразумевало је израду услова и мера техничке заштите, исходовање старатељства од стране Министарства културе и информисања Републике Србије, израду прописане техничке документације, прибављање неопходних аката у складу с прописима о планирању и изградњи објеката и прописа о комуналном уређењу града, спровођење јавних набавки, извођење радова и вршење стручног и конзерваторског надзора. Због ефикаснијег спровођења, реализација је планирана у четири фазе. Напомињемо да су, од Програмом планираних радова на 21 објекту, након спроведеног поступка Јавне набавке, а услед уложених приговора, током 2017. године уговорени радови на 19 објеката, у укупном износу од 67.177.377,36 РСД (са ПДВ-ом). Радови на преостала два објекта уговорени су 2018. године, по приспећу Одлуке о одбијању захтева за заштиту права, у износу од 29.722.746,60 РСД (са ПДВ-ом). До данас, радови на свим објектима су завршени, укупно 21.


Напомињемо да је Завод у целости извршио све обавезе везане за Програм спровођења мера техничке заштите објеката у саставу просторно културно-историјске целине Горња и доња тврђава с подграђем у Петроварадину за 2017. годину, по тачкама IV и V, а да су кашњења везана за реализацију у делу извођења радова последица, у првом реду, дугог поступка јавних набавки, као и улагања приговора на исте, потом непредвиђених околности везаних за заштиту ретких врста сходно Закону о заштити природе, реализације пројекта реконструкције Улице проте Михалцића, Лисинског и Назорове, као и екстремних временских услова који су обележили 2017. годину.

У прилогу:

1. Табела са прегледним стањем реализације Програма спровођења мера техничке заштите објеката у саставу просторно културно-историјске целине Горња и доња тврђава са подграђем у Петроварадину за 2017. годину, по фазама I – IV

ДОСТАВИТИ :

1. Наслову
2. Рачуноводству
3. Документацији
4. Архиви

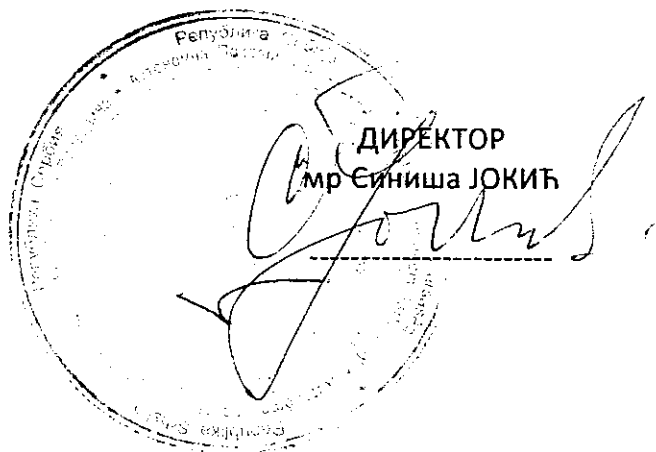

ФАЗА I ЈН ОП 1.3.1/2017 (24. 03. 2017.)				
парт. бр.	Објекат	Почетак радова	Реализација (%)	Вредност радова (с ПДВ-ом)
1.	Трг владике Николаја 3	29.05. 2017.	100%	5.121.634,80
2.	Београдска 2	29.05. 2017.	100%	3.379.602,00
3.	Београдска 4	29.05. 2017.	100%	2.132.300,40
4.	Трг владике Николаја 1	29.05. 2017.	100%	2.457.249,60
5.	Лисинског 2	29.05. 2017.	100%	7.940.532,00
6.	Београдска 8	29.05. 2017.	100%	3.043.764,00
УКУПНО:				24.075.082,80

ФАЗА II ЈН ОП 1.3.2/2017 (14. 04. 2017.)				
парт. бр.	Објекат	Почетак радова	Реализација (%)	Вредност радова (с ПДВ-ом)
1.	Београдска 1	25. 07. 2017.	100%	1.041.272,40
2.	Београдска 3	25. 07. 2017.	100%	3.165.590,40
3.	Београдска 5	25. 07. 2017.	100%	1.060.725,60
4.	Београдска 7	25. 07. 2017.	100%	1.466.559,96
5.	Београдска 9	25. 07. 2017.	100%	5.063.634,00
УКУПНО:				11.797.782,36

ФАЗА III ЈН ОП 1.3.3/2017 (03. 07. 2017.)				
парт. бр.	Објекат	Почетак радова	Реализација (%)	Вредност радова (с ПДВ-ом)
1.	Београдска 11	29.11. 2017.	100%	6.958.530,00
2.	Београдска 13	29.11. 2017.	100%	2.701.176,00
3.	Београдска 15	29.11. 2017.	100%	1.392.126,00
4.	Београдска 17	29.11. 2017.	100%	1.871.208,00
5.	Београдска 19	29.11. 2017.	100%	4.917.334,20
УКУПНО:				17.840.374,20

ФАЗА IV ЈН ОП 1.3.4/2017 (01. 07. 2017.)				
парт. бр.	Објекат	Почетак радова	Реализација (%)	Вредност радова (с ПДВ-ом)
1.	Лисинског 1	7.08. 2018.	100%	7.537.566,60
2.	Штросмајерова 1	29.11. 2017.	100%	3.058.058,40
3.	Штросмајерова 3	29.11. 2017.	100%	5.143.173,60
4.	Проте Михалцића 14	23.07. 2018.	100%	5.262.906,00
5.	Београдска 23-25	7.08. 2018.	100%	22.185.180,00
УКУПНО:				43.186.884,60

ФАЗЕ I - IV, УГОВОРЕНО 2017. И РЕАЛИЗОВАНО, СВЕУКУПНО:	96.900.123,96
---	----------------------
