

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2021-130-II
Дана: 01. априла 2021. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2020. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2021-130-II од 01. априла 2021. године, с молбом да се дневни ред XII седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 05. април 2021. године, допуни разматрањем Извештаја о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2020. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године, и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту, у циљу благовременог извештавања.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић

У складу са чланом 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2020. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године, Градско веће Града Новог Сада, на 45. седници од 01. априла 2021. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, председници Скупштине Града Новог Сада доставља се Извештај о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2020. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад усвојио на 12. седници одржаној 15. марта 2021. године и предлаже се Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2020. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2021-130-II
Дана: 01. априла 2021. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић

РЕФЕРАТ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада је на LVIII седници, од 12. децембра 2019. године, донела Решење о давању сагласности на Програм инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2020. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/19) који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад донео на 101. седници, одржаној 28. новембра 2019. године.

Чланом 5. наведеног програма дефинисано је да Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада годишњи извештај о реализацији Програма, са исказаним физичким и финансијским показатељима о извршеним активностима и утршку средстава.

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2020. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад усвојио на 12. седници одржаној 15. марта 2021. године.

За реализацију наведеног програма планирана су средства Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад у износу од 246.991.475,41 динара, од чега се 46.991.475,41 динара односи на инвестициона улагања, а 200.000.000,00 динара на текуће одржавање водовода и канализације.

II. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

Водовод

Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у насељу Подбара, са набавком и уградњом материјала

На основу спроведеног поступка јавне набавке дана 18. септембра 2019. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Bulevar Соор" доо из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Rad GM" доо из Крушевца, "Bauwesen" доо из Лазаревца, "Колубара" доо из Мионице, "Borad" доо из Сремске Митровице и "Sloboda Građevinar 1947" доо из Обреновца, на уговорену вредност од 12.999.901,53 динара. Рок за извођење радова био је 55 календарских дана, а извођач је уведен у посао дана 18. октобра 2019. године. У току изградње, одустало се од реконструкције водоводне мреже у Даничићевој улици, јер је иста у добром стању, као и од реконструкције водоводне мреже у улици Ђорђа Јовановића јер иста није била у плану радова за партерно уређење Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, које је било синхронизовано са радовима на реконструкцији водоводне мреже на наведеном локалитету. Сходно наведеном, закључен је Анекс 1 Уговора којим је смањена уговорена вредност радова, на вредност стварно изведених радова од 8.327.921,95 динара, а радови су у потпуности завршени дана 12. фебруара 2020. године.

Канализација

Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у насељу Подбара, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације уговорених обавеза

На основу спроведеног поступка јавне набавке дана 27. септембра 2019. године закључен је уговор о извођењу радова са „Енерги про“ доо као носиоцем посла у заједничкој понуди са „Новкол“ ад Београд чија уговорена вредност износи 33.991.573,88 динара. Извођач радова је дана 25. октобра 2019. године уведен у посао, уговорени рок за извођење радова износио је 120 дана, али су радови обустављани у више наврата, како због радова на партерном

уређењу, затим због уклањања дрвећа у улици Душана Васиљева, као и због околности насталих услед пандемије изазване вирусом Covid-19. У току изградње, појавила се потреба за извођењем вишкова радова који су били неопходни за завршетак инвестиције те је закључен Анекс 1 Уговора којим је увећана уговорена вредност радова на 35.689.613,50 динара. Радови су у потпуности завршени дана 22. маја 2020. године. Укупна вредност изведених радова износи 35.689.613,50 динара.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Водовод

-Праћење и одржавање евиденције стања јавних чесми и бунара (Катастар)

У извештајном периоду није било реализације по овој позицији јер нису изграђени нови објекти (нема објеката за евидентирање).

-Одржавање јавних чесми

У оквиру ове позиције у току 2020. године реализовано је 10 радних налога на отклањању кварова на јавним чесмама на територији Града Новог Сада, по пријавама грађана. Реализована су средства у износу од 65.860,00 динара.

-Одржавање, ревитализација и санација јавних копаних и бушених бунара и објеката

У извештајном периоду није било реализације по овој позицији

-Ликвидација - санација објеката и бунара

У извештајном периоду није било реализације по овој позицији

-Катастар надземних хидраната, оспособљавање постојећих, обележавање мреже нових хидраната

У извештајном периоду за потребе поправки и интервенција на хидрантима реализовано је 59 радних налога при чему је новим хидрантима замењено 16 надземних хидраната DN 80 и два подземна хидранта DN 80. На овој позицији реализована су средства у износу од 1.989.413,00 динара, што је знатно више од планираних средстава.

-Интервентно снабдевање пијаћом водом вршено је због прекида водоснабдевања а као последица хаварија на систему, блокаде водоводне мреже и по налогу инспекцијских служби.

За интервентно снабдевање пијаћом водом, цистернама, реализована су 54 радна налога, због прекида водоснабдевања као последица хаварија на систему и планираних инвестиционих радова.

У извештајном периоду реализована су средства у износу од 2.455.721,00 динара.

-Хаварије на секундарној мрежи водовода

Санације хаварија вршене су по пријавама грађана и налозима Градске управе за инспекцијске послове и Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

У 2020. години пријављено је 4.076 кварова и недостатака на водоводној мрежи. Као кварови и недостаци пријављивани су: цурење воде на хидранту, јавној површини и у водомерном шахту, кварови на вентилима и јавним чесмама, нестанак и слаб притисак воде, замућеност воде, појава воде у подруму, и др.

У оквиру ове позиције реализовано је 267 радних налога на довођењу раскопаних јавних површина у првобитно стање, санацији оштећених шахтова и замени украдених поклопаца. Реализована средства у 2020. години износе 80.541.557,22 динара, што је знатно више од планираног износа.

-Интервентно одржавање водоводне мреже по налогу инспекцијских служби.

У извештајном периоду није било реализације по овој позицији.

Канализација

Одржавање атмосферске канализације је вршено редовно и подразумева планиране послове на прању канализационе мреже свих пречника, прању главних канализационих колекторских праваца, прању сливника и сливничких прикључака, замени оштећених рамова и поклопаца на шахтовима, замени оштећених рамова и сливничких решетки на сливницима, прање базена црпних станица канализације, пражњење корпи и контејнера са механичким нечистоћама на црпним станицама и постројењима за пречишћавање отпадних вода, одржавање и редовне сервисе хидромашинске опреме црпних станица канализације,

одржавање и редовне сервисе електро опреме црпних станица канализације као и праћење рада црпних станица канализације путем даљинског надзора. Наведена позиција реализована је већем у обиму од планираног и то у износу од 82.073.224,00 динара.

Интервентни радови

У извештајном периоду вршени су: санација или замена физички хаварисаних делова канализационе мреже, прикључака и шахтова, уклањање механичких препрека у канализационој мрежи, прикључцима и шахтовима, одгушења на мрежи, прикључцима и шахтовима, отклањање застоја у раду хидромашинске и електроопреме црпних станица канализације, отклањање застоја у раду опреме на постројењима за пречишћавање отпадних вода, интервенције услед већих падавина, као и рад интервентних дежурних служби. Реализована су средства у већем обиму од планираног и то у износу од 57.752.773,00 динара.

III. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године, Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад од планираних 46.991.475,41 динара за инвестициона улагања реализовало је укупно 44.017.535,45 динара, односно 93,67%.

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА - табеларни приказ


Позиција	Програмска позиција	Планирана средства за 2020. годину	Реализовано до 31.12.2020. године	Проценат 4/3 (%)
1	2	3	4	5
	ВОДОВОД	12.999.901,53	8.327.921,95	64,06%
	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у насељу Подбара, са набавком и уградњом материјала	12.999.901,53	8.327.921,95	64,06%
	КАНАЛИЗАЦИЈА	33.991.573,88	35.689.613,50	105,00%
	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у насељу Подбара, са набавком материјала – наставак реализације уговорених обавеза	33.991.573,88	35.689.613,50	105,00%
	УКУПНО:	46.991.475,41	44.017.535,45	93,67%

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године, Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад уместо планираних 200.000.000,00 динара за текуће одржавање водовода и канализације реализовало је укупно 224.878.548,22 динара, односно 112,44% у односу на планирана средства.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ-табеларни приказ

Позиција	Програмска позиција	Планирана средства за 2020. годину	Реализовано до 31.12.2020. године	Проценат 4/3 (%)
1	2	3	4	5
	ВОДОВОД	80.000.000,00	85.052.551,22	106,32%
	Праћење и одржавање евиденције стања јавних чесми и бунара (Катастар)	100.000,00	-	-
	Одржавање јавних чесми	2.900.000,00	65.860,00	2,27%
	Одржавање, ревитализација и санација јавних копаних и бушених бунара и објеката	1.000.000,00	-	-
	Ликвидација - санација објеката и бунара	500.000,00	-	-
	Катастар надземних хидраната, оспособљавање постојећих, обележавање мреже нових хидраната	1.000.000,00	1.989.413,00	198,94%
	Интервентно снабдевање пијаћом водом	4.000.000,00	2.455.721,00	61,39%
	Хаварије на секундарној мрежи водовода	70.000.000,00	80.541.557,22	115,06%
	Интервентно одржавање водоводне мреже по налогу инспекцијских служби	500.000,00	-	-
	КАНАЛИЗАЦИЈА	120.000.000,00	139.825.997,00	116,52%
	Одржавање атмосферске канализације	70.000.000,00	82.073.224,00	117,25%
	Интервентни радови	50.000.000,00	57.752.773,00	115,51%
	УКУПНО:	200.000.000,00	224.878.548,22	112,44%



В.Д. НАЧЕЛНИКА

Зоран Станојевић



Број:4.3.- 6004/1

Датум: 15.март 2021. године.

На основу члана 12. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Водовод и канализација" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16 и 46/20), и члана 33. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад од 20.10.2016. и 01.06.2017.године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на 12.седници одржаној 15. марта 2021. године, доноси

ОДЛУКУ

I. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2020. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, за период 01.јануар-31.децембар 2020.године, а који је саставни део ове одлуке.

II. Извештај из тачке I. ове одлуке, доставити Скупштини Града Новог Сада на разматрање.



Милан Кравић

Достављено:

- Градској управи за комуналне послове
- Директору предузећа
- Техничком директору
- Сектору финансијских послова
- Сектору инвестиционо технички
- Сектору правних и општих послова
- Архиви



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

ИЗВЕШТАЈ

о реализацији Програма инвестиционих улагања
Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и
текућег одржавања водовода и канализације за 2020. годину
који се не финансира из буџета Града Новог Сада,

за период 01. јануар - 31. децембар 2020. године

Програм инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2020. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, донет је у складу са чланом 12. став 1. тачка 22. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Комуналне радне организације "Водовод и канализација" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Програм инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2020. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/19).

Наведеним Програмом планирана су средства у износу од 246.991.475,41 динара, од чега се 46.991.475,41 динара односило на инвестициона улагања, а 200.000.000,00 динара на текуће одржавање водовода и канализације.

I ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

У извештајном периоду од 01. јануара - 31. децембра 2020. године у потпуности су реализоване инвестиције предвиђене наведеним Програмом и то:

- Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у насељу Подбара, са набавком и уградњом материјала

За наведену инвестицију, дана 18.09.2019. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Bulevar Coop" d.o.o. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Rad GM" d.o.o. из Крушевца, "Bauwesen" d.o.o. из Лазаревца, "Колубара" d.o.o. из Мионице, "Borad" d.o.o. из Сремске Митровице и "Sloboda Građevinar 1947" d.o.o. из Обреновца, на уговорену вредност од 12.999.901,53 динара. Рок за извођење радова био је 55 календарских дана. Извођач је уведен у посао 18.10.2019. године. У току изградње, констатовано је да је водоводна мрежа у Даничићевој улици у насељу Подбара у добром стању и од одговарајућих материјала, те да није потребно извршити њену реконструкцију. Такође, како су радови на изградњи водоводне мреже били синхронизовани са радовима на партерном уређењу од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, а улица Ђорђа Јовановића није била у плану радова за партерно уређење, тако се одустало од реконструкције водоводне мреже у поменутој улици. Сходно наведеном, а у складу са обрачунским листовима грађевинске књиге, надзорни орган сачинио је извештај нереализованих уговорених количина радова (мањкова радова), те је Предузеће закључило Анекс број 1 Уговора бр. 5.2.-28796 од 18.09.2019. године, којим анексом је измењена уговорена вредност радова, у смислу смањења исте и сада износи 8.327.921,95 динара. У извештајном периоду, радови су обухватили: геодетске, припремне, земљане, тесарске, инсталатерске радове односно набавку, транспорт и монтажу: водоводних цеви и фазонских комада од полиетилена, водоводних цеви, фазонских комада и арматуре од дуктилног лива, надземног противпожарног хидранта, затим бетонске радове односно израду бетонских шахтова, затварачница, анкер блокова и остале неопходне радове као што су: испитивање цевовода на пробни притисак, испирање и дезинфекција цевовода, раскопавање постојећих коловозних конструкција, тротоара, и бетонских и површина од туцаника и довођење истих у функционално стање, постављање и одржавање саобраћајне сигнализације, етажирање и заштиту постојећих инсталација, обезбеђивање постојећих стабала као и стављање старе мреже ван функције. Радови су у потпуности завршени дана 12.02.2020. године. Сходно

Закону о планирању и изградњи, сачињен је пројекат изведеног стања. Изведени су сви уговорени радови, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност изведених радова износи 8.327.921,95 динара.

- Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у насељу Подбара, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације уговорених обавеза

За наведену инвестицију, дана 27.09.2019. године закључен је уговор са извођачем "Energy pro" д.о.о. из Новог Сада, као носиоцем посла у заједничкој понуди са "Новкол" а.д. Београд, на уговорену вредност од 33.991.573,88 динара. Рок за извођење радова био је 120 календарских дана. Извођач је уведен у посао 25.10.2019. године, али су радови обустављани у више наврата односно због координације са Градском управом за грађевинско земљиште и инвестиције у вези радова на партерном уређењу, затим уклањања дрвећа у улици Душана Васиљева као и због околности насталих услед пандемије изазване вирусом Covid-19. У току изградње, појавила се потреба за извођењем вишкова радова који су били неопходни за завршетак уговорених радова и неометано функционисање канализационе мреже. Сходно наведеном, од стране надзорног органа сачињени су извештаји о вишковима радова на основу којих су добијена овлашћења за реализацију, те је Предузеће закључило Анекс број 1 Уговора бр. 5.2.-29802 од 27.09.2019. године, за вишкове радова, којим анексом је увећана уговорена вредност радова и износи 35.689.613,50 динара. У извештајном периоду, радови су обухватили: геодетске, припремне, земљане, тесарске, инсталатерске радове односно набавку, транспорт и монтажу канализационих полипропиленских и ПВЦ цеви као и фазонских комада, затим бетонске радове односно израду бетонских шахтова, ревизионих силаза и сливника и остале неопходне радове као што су: постављање и одржавање саобраћајне сигнализације, раскопавање постојећих коловозних конструкција, ивичњака и тротоара и довођење истих у функционално стање, обезбеђивање градилишта, постављање и одржавање саобраћајне сигнализације, снижење нивоа подземних вода и заштиту постојећих инсталација. Радови су у потпуности завршени дана 22.05.2020. године. Сходно Закону о планирању и изградњи, сачињен је пројекат изведеног стања. Изведени су сви уговорени радови, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

Укупна вредност изведених радова износи 35.689.613,50 динара.

II ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Радови на одржавању водоводне и канализационе мреже финансирани су сопственим средствима Предузећа, те су планирани у укупном износу од 200.000.000,00 динара, где се наведена средства односе на радове из групе радова I - водовод у износу од 80.000.000,00 динара и на радове из групе радова II - канализација у износу од 120.000.000,00 динара.

У односу на планиране позиције текућег одржавања водовода и канализације за 2020. годину, утрошена сопствена средства Предузећа исказана у процентима у односу на планирана средства, у извештајном периоду, износе 112,44%, где се наведена средства односе на радове из групе радова I - водовод у износу од 85.052.551,22 динара односно 106,32% и на радове из групе радова II - канализација у износу од 139.825.997,00 динара односно 116,52%, што се види из табеларног приказа реализације текућег одржавања водовода и канализације за 2020. годину.

Наведене програмске позиције обухватају следеће послове:

Група радова I – водовод

Праћење и одржавање евиденције стања јавних чесми и бунара (Катастар) - на годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 100.000,00 динара. У извештајном периоду нису изграђени нови објекти (нема објеката за евидентирање), те средства нису реализована.

Одржавање јавних чесми подразумева одржавање водоводних и канализационих инсталација у исправном стању за јавне чесме на јавној површини које су евидентирани у катастру јавних чесми и снабдевају се са система Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 2.900.000,00 динара У извештајном периоду реализација средстава је 65.860,00 динара, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 2,27 %.

Одржавање, ревитализација и санација јавних копаних и бушених бунара и објеката

ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад, Сектор "Водовод" врши редован обилазак јавних копаних бунара и чесми на годишњем нивоу, а ванредно обилази и проверава већ постављена обавештења и обележја на основу обавештења Градске управе за комуналне послове и Сектора за санитарни надзор и јавно здравље Покрајинског секретаријата за здравство и извештаја Института за јавно здравље Војводине о исправности воде за пиће на поменутиим објектима. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било потребе за ангажовањем средстава, те средства нису реализована.

Ликвидација - санација објеката и бунара врши се ради заштите водоносних слојева од могућег загађења (случајног или намерног), пошто представљају директни контакт са подземним водама, као и да би се спречила неконтролисана експлоатација. Ликвидацију-санацију неопходно је извршити стручно, са дезинфекцијом и обележавањем терена, због могућих накнадних радова (изградње нових објеката). На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 500.000,00 динара. У извештајном периоду, није било потребе за ликвидацијом, односно санацијом бунара, те средства нису реализована.

Катастар надземних хидраната, оспособљавање постојећих, обележавање мреже нових хидраната

Служба ГИС-а у својим базама чува податке о броју, типу, стању и локацији свих евидентираних хидраната на својој мрежи. Из овог електронског катастра се преко графичког интерфејса или упита у бази може врло ефикасно пронаћи један или више хидраната по одређеном критеријуму. Подаци се ажурирају у складу са радом службе "Одржавање водоводне мреже" која доноси податке са терена. Значај исправности информација о овим елементима нарочито се огледа у раду Ватрогасно-спасилачке бригаде Нови Сад, којој хидранти служе за пуњење цистерни у току интервенција. Служба "Одржавање водоводне мреже" изводи радове на оспособљавању постојећих хидраната. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара. У извештајном периоду реализација средстава је 1.989.413,00 динара, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 198,94%.

Интервентно снабдевање пијаћом водом вршено је због прекида водоснабдевања, а као последица хаварија на систему, блокаде водоводне мреже и по налогу инспекције. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара. У извештајном периоду реализација средстава је 2.455.721,00 динара, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 61,39%.

Хаварије на секундарној мрежи водовода

Санације хаварија вршене су по пријавама грађана и налозима Градске управе за инспекцијске послове и Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције. Дотрајалост мреже захтева хитну интервенцију и поправку са циљем да се побољша функционисање мреже, спречи угроженост грађана, као и осигура безбедност одвијања саобраћаја. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 70.000.000,00 динара. У извештајном периоду реализација средстава је 80.541.557,22 динара, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 115,06%.

Интервентно одржавање водоводне мреже по налогу инспекцијских служби - служба "Одржавање водоводне мреже", услед поремећаја снабдевања пијаћом водом, а на захтев корисника услуга и по налогу Градске управе за инспекцијске послове, врши послове на интервентном одржавању водоводне мреже. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 500.000,00 динара. У извештајном периоду није било налога инспекцијских служби за интервентно одржавање водоводне мреже, те средства нису реализована.

Група радова II – канализација

Одржавање атмосферске канализације се врши редовно и подразумева планиране послове на прању канализационе мреже свих пречника, прању главних канализационих колекторских праваца, прању сливника и сливничких прикључака, замени оштећених рамова и поклопаца на шахтовима, замени оштећених рамова и сливничких решетки на сливницима, прање базена црпних станица канализације, пражњење корпи и контејнера са механичким нечистоћама на црпним станицама и постројењима за пречишћавање отпадних вода, одржавање и редовне сервисе хидромашинске опреме црпних станица канализације, одржавање и редовне сервисе електро опреме црпних станица канализације, као и праћење рада црпних станица канализације путем даљинског надзора. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 70.000.000,00 динара. У извештајном периоду реализација средстава је 82.073.224,00 динара, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 117,25%.

Интервентни радови подразумевају: санацију или замену физички хаварисаних делова канализационе мреже, прикључака и шахтова; уклањање механичких препрека у канализационој мрежи, прикључцима и шахтовима; одгушења на мрежи, прикључцима и шахтовима; отклањање застоја у раду хидромашинске и електроопреме црпних станица канализације; отклањање застоја у раду опреме на постројењима за пречишћавање отпадних вода; интервенције услед већих падавина, као и рад интервентних дежурних служби. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 50.000.000,00 динара. У извештајном периоду реализација средстава је 57.752.773,00 динара, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 115,51%.

Табеларни приказ реализације текућег одржавања водовода и канализације за 2020. годину

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ - ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	планирана средства за 2020. годину	реализовано до 31.12.2020. године	% реализације
			4 : 3
2	3	4	5
I ВОДОВОД	80.000.000,00	85.052.551,22	106,32%
Праћење и одржавање евиденције стања јавних чесми и бунара (Катастар)	100.000,00	0,00	0,00%
Одржавање јавних чесми	2.900.000,00	65.860,00	2,27%
Одржавање, ревитализација и санација јавних копаних и бушених бунара и објеката	1.000.000,00	0,00	0,00%
Ликвидација - санација објеката и бунара	500.000,00	0,00	0,00%
Катастар надземних хидраната, оспособљавање постојећих, обележавање мреже нових хидраната	1.000.000,00	1.989.413,00	198,94%
Интервентно снабдевање пијаћом водом	4.000.000,00	2.455.721,00	61,39%
Хаварије на секундарној мрежи водовода	70.000.000,00	80.541.557,22	115,06%
Интервентно одржавање водоводне мреже по налогу инспекцијских служби	500.000,00	0,00	0,00%
II КАНАЛИЗАЦИЈА	120.000.000,00	139.825.997,00	116,52%
Одржавање атмосферске канализације	70.000.000,00	82.073.224,00	117,25%
Интервентни радови	50.000.000,00	57.752.773,00	115,51%
УКУПНО ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ:	200.000.000,00	224.878.548,22	112,44%

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА за 2020. годину - опис послова

Одржавање јавних чесми

Служба одржавања водоводне мреже реализовала је 10 радних налога за отклањање кварова на јавним чесмама у 2020. години, по пријавама грађана. Укупна вредност извршених радова је 65,860.00 динара.

Катастар надземних хидраната, оспособљавање постојећих, обележавање мреже нових хидраната

За потребе поправки и интервенција на хидрантима реализовано је 59 радних налога при чему је замењено 15 надземних и 2 подземна хидраната новим.

Надземни хидранти DN 80 замењени су на следећим локацијама:

1. ВУКА КАРАЦИЋА 10, НОВИ САД
2. РИБАРСКА 51, КОВИЉ
3. РАШКА, НОВИ САД
4. ВУКА КАРАЦИЋА 10, НОВИ САД
5. ЗРЕЊАНИНСКИ ПУТ, НОВИ САД
6. НАРОДНОГ ФРОНТА 18, НОВИ САД
7. ОСЛОБОЂЕЊА 1, РУМЕНКА
8. ЛАЗЕ НАНЧИЋА 59, НОВИ САД
9. ГРИГОВАЧКИ ПУТ 131, СРЕМСКА КАМЕНИЦА
10. ХОПОВСКА 10, СТАРИ ЛЕДИНЦИ
11. ФУТОШКИ ПУТ 28, НОВИ САД
12. КРАЉА АЛЕКСАНДРА 75, ВЕТЕРНИК
13. ЦАРА ЛАЗАРА 51, ФУТОГ
14. БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 36, НОВИ САД
15. КАРАС ПАЛА 24, НОВИ САД

Подземни хидранти DN 80 замењени су на следећим локацијама:

1. ЈУГОСЛОВЕНСКЕ НАРОДНЕ АРМИЈЕ 3, СТЕПАНОВИЋЕВО
2. БУЛЕВАР ДЕСПОТА СТЕФАНА 14, НОВИ САД

Интервентно снабдевање пијаћом водом

За интервентно снабдевање пијаћом водом цистернама реализована су 54 радна налога због прекида водоснабдевања као последица хаварија на систему и планираних инвестиционих радова.

Хаварије на секундарној мрежи водовода

У 2020. години пријављено је 4.076 кварова и недостатака на водоводној мрежи, од тога:

- [B] CURENJE NA HIDRANTU - реализовано је 59 радних налога
- [C] CURENJE NA JAVNOJ POVRŠINI - реализовано је 1210 радних налога
- [D] CURENJE U VODOMERNOM ŠAHТУ - реализовано је 1652 радних налога
- [E] KVAR NA 1. VENTILU VODOMERNOG SETA - реализовано је 136 радних налога
- [F] KVAR NA 2. VENTILU VODOMERNOG SETA - реализовано је 159 радних налога
- [G] KVAR NA JAVNOJ CESMI - реализовано је 10 радних налога
- [I] MUTNA VODA - реализовано је 76 радна налога
- [K] NEMA VODE - реализовано је 258 радних налога
- [N] SLAB PRITISAK VODE - реализовано је 175 радних налога
- [OST] OSTALO - реализовано је 290 радних налога
- [O] VODA U OBJEKTU (PODRUMU) - реализовано је 35 радних налога
- [P] UGROŽENA BEZBEDNOST ILI ZDRAVLJE LJUDI - реализовано је 8 радних налога
- [W] ISPIRANJE - реализовано је 8 радних налога

Највећи број налога за отклањање хаварије на водоводној мрежи, реализован је за улицу Рибњак - Доњи пут, Петроварадин (укупно 47).

За отклањање цурења воде на јавној површини, највећи број налога реализован је у Рибњак - Доњи пут, Петроварадин (укупно 38) и Липарје, Лединци (укупно 22).

Највећи број пријава пристигао је у јулу (492 пријава) и септембру (418 пријава).

Најмањи број пријава пристигао је у марту и априлу (220 пријава).

Грађевинска група је извршила 267 радних налога, што је обухватило довођење раскопаних јавних површина у првобитно стање, санацију оштећених шахтова и замену украдених поклопаца.

Хаварија на водоводној мрежи, за коју је утрошено највише средстава:

- за радове на Мишелуку у Сремској Каменици (01.10.2020. године), утрошено је 1.427.748,00 динара.

На годишњем нивоу, највише средстава се утроши на отклањање хаварија у Рибњаку, Доњи пут.

Највећи број пријава и хаварија (цурење на јавној површини) по улицама:

УЛИЦА	НАСЕЉЕНО МЕСТО	ПРИЈАВА	ХАВАРИЈЕ НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ
Рибњак доњи пут	Петроварадин	47	38
Фрушкогорски пут	Сремска Каменица	43	17
Липарје	Нови Лединци	29	22
Карађорђева	Буковац	32	11

Табеларни приказ пријава на водоводој мрежи у 2020.години

РЕГИОН	[B] CURENJE NA HIDRANTU	[C] CURENJE NA JAVNOJ POVRŠINI	[D] CURENJE U VODOMERNOM ŠAHTU	[E] KVAR NA 1. VENTILU VODOMERNOG SETA	[F] KVAR NA 2. VENTILU VODOMERNOG SETA	[G] KVAR NA JAVNOJ CESMI	[I] MUTNA VODA	[K] NEMA VODE	[N] SLAB PRITISAK VODE	[O] VODA U OBJEKTU-PODRUMU	[OST] Ostalo	[P] UGROŽENA BEZBEDNOST ILI ZDRAVLJE LJUDI	[W] ISPIRANJE	
ЈАНУАР_2020	3	71	104	7	12	3	7	14	11	3	20	3	0	258
ФЕБРУАР_2020	4	71	132	6	14	0	2	6	12	0	29	1	0	277
МАРТ_2020	3	61	106	3	5	0	4	13	8	0	17	0	0	220
АПРИЛ_2020	9	73	105	3	0	0	2	11	7	2	7	0	1	220
МАЈ_2020	5	97	204	18	14	3	11	13	17	2	17	2	1	404
ЈУН_2020	6	107	159	12	24	3	9	21	9	0	34	0	1	385
ЈУЛ_2020	9	161	161	23	18	0	13	57	9	6	31	0	4	492
АВГУСТ_2020	8	153	126	7	18	0	7	22	21	5	25	0	0	392
СЕПТЕМБАР_2020	2	134	141	12	12	0	9	47	18	5	37	0	1	418
ОКТОБАР_2020	3	132	147	13	9	0	7	28	34	3	29	1	0	406
НОВЕМБАР_2020	5	71	148	17	15	0	4	19	11	2	23	1	0	316
ДЕЦЕМБАР_2020	2	79	119	15	18	1	1	7	18	7	21	0	0	288
2020	59	1210	1652	136	159	10	76	258	175	35	290	8	8	4076

РЕЈОН СВИ 2020

250

200

150


100

50


0

ЈАНУАР_2020 ФЕБРУАР_2020 МАРТ_2020 АПРИЛ_2020 МАЈ_2020 ЈУН_2020 ЈУЛ_2020 АВГУСТ_2020 СЕПТЕМБАР_2020 ОКТОБАР_2020 НОВЕМБАР_2020 ДЕЦЕМБАР_2020

- [B] CURENJE NA HIDRANTU_59
- [C] CURENJE NA JAVNOJ POKRŠENI_1210
- [D] CURENJE U VODOOMERNOM ŠAHTU_1652
- [E] KVAR NA 1. VENTILU VODOOMERNOG SETA_136
- [F] KVAR NA 2. VENTILU VODOOMERNOG SETA_159
- [G] KVAR NA JAVNOJ CESTI_10
- [H] MUTNA VODA_76
- [I] NEMA VODE_258
- [J] SLAB PRITISAK VODE_175
- [K] VODA U OBJEKTU-PODRUČJU_35
- [L] OSTALO_290
- [M] UGROŽENA BEZBEDNOST ILI ZDRAVLJE LUDI_8
- [N] ISPIRANJE_8

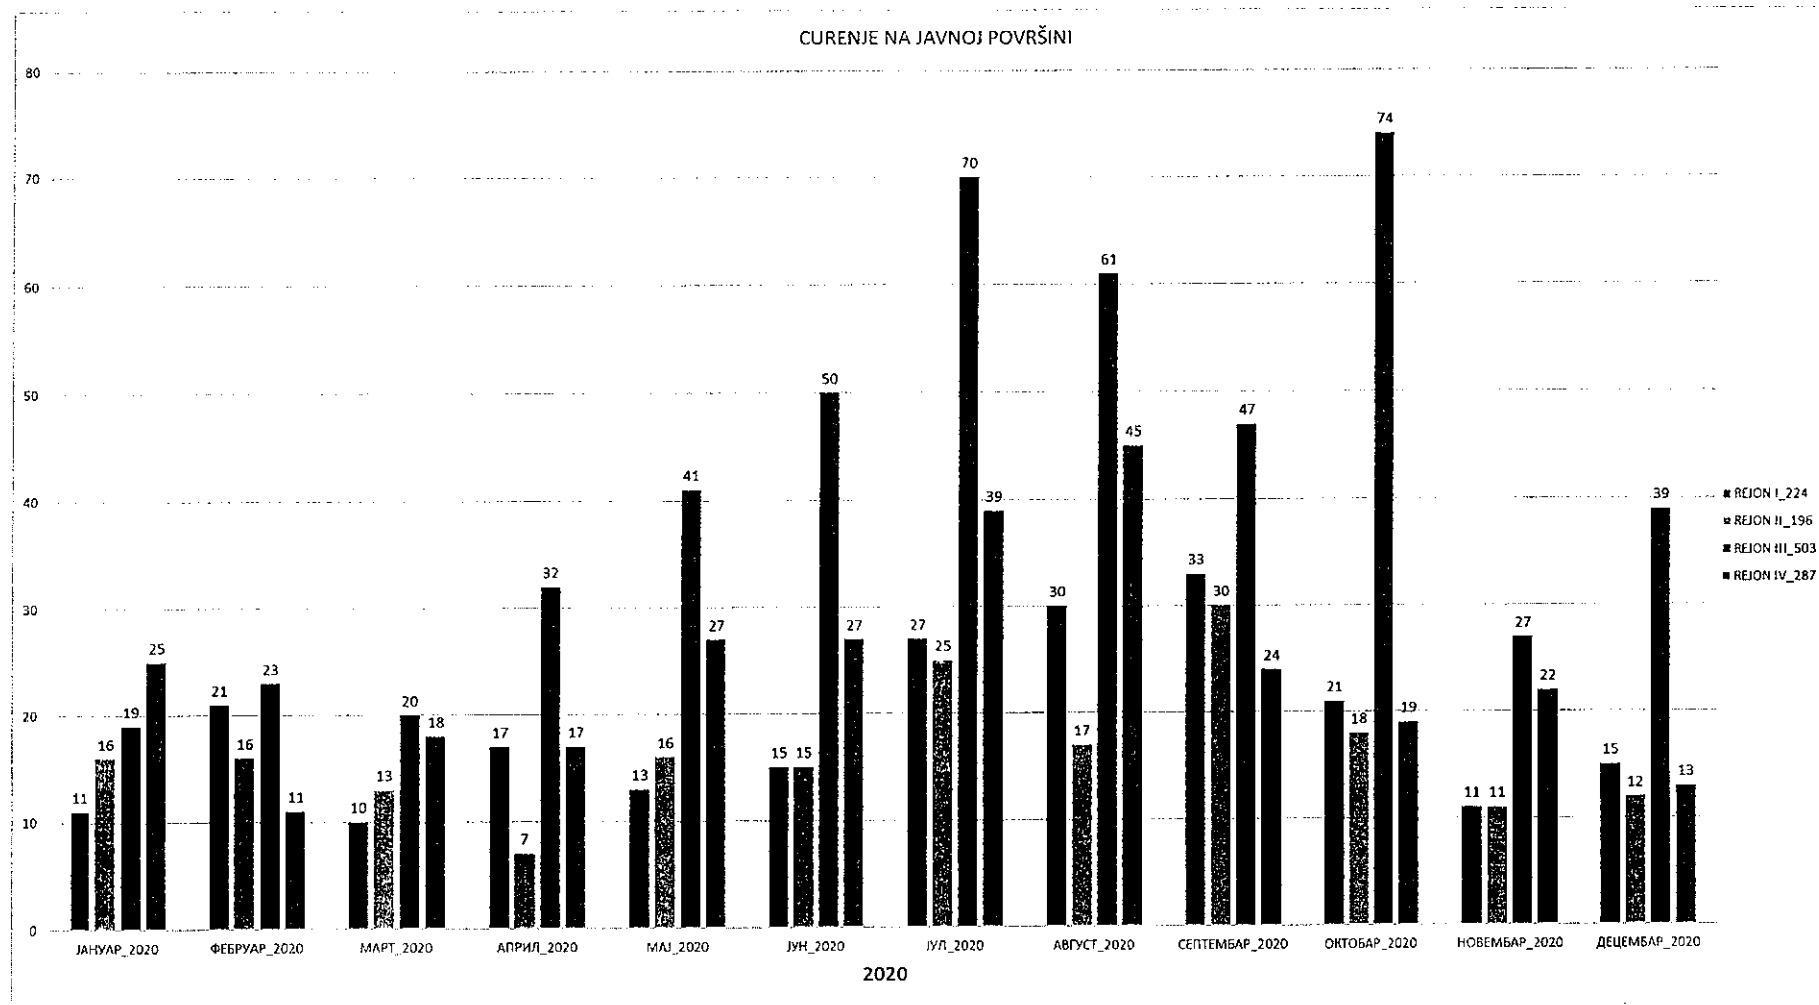

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ за 2020. годину – опис послова

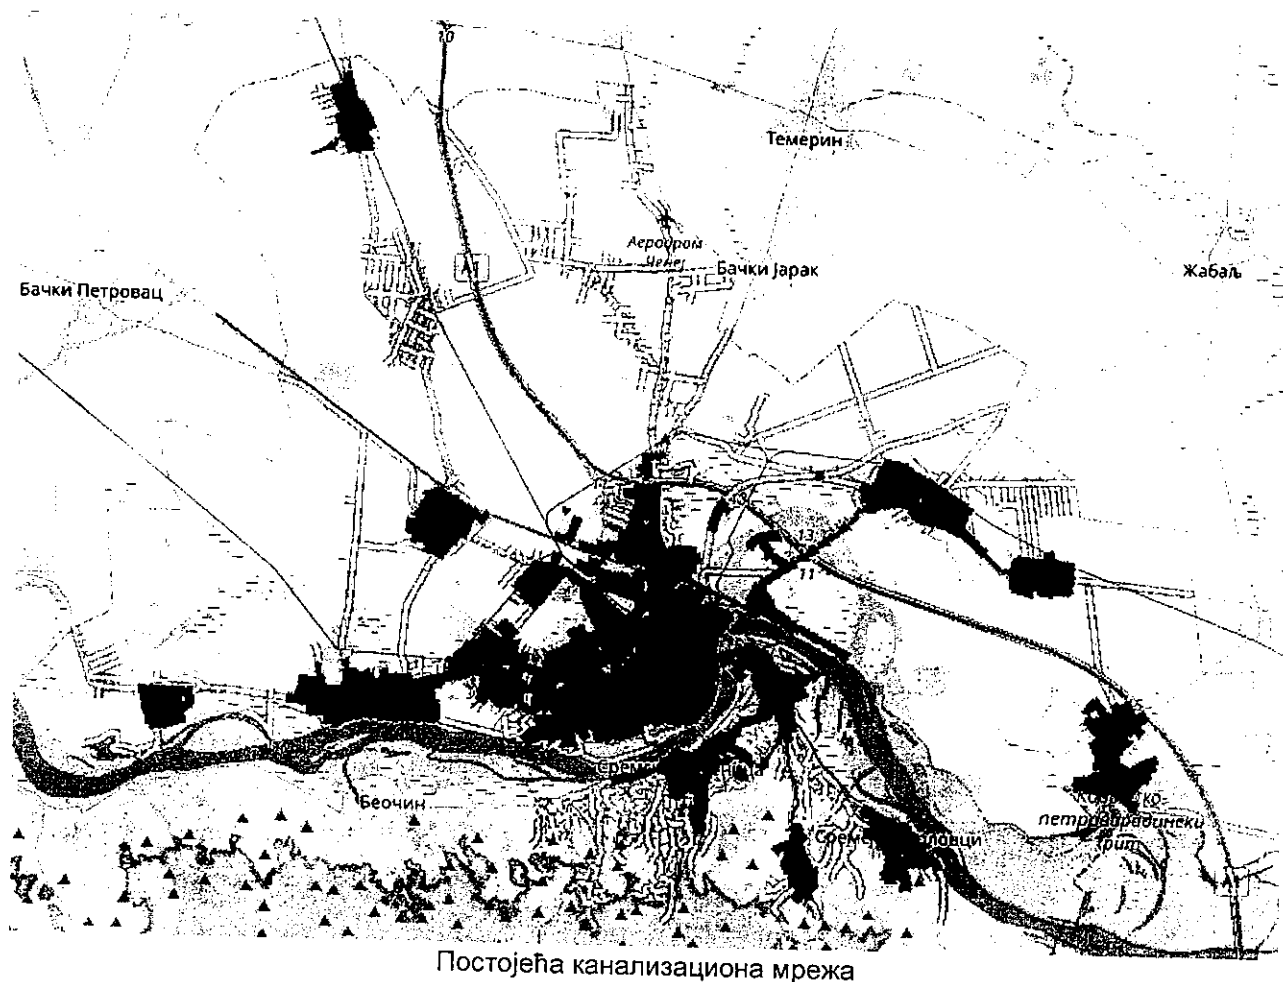

Послови на текућем одржавању канализације се обављају на територији Града Новог Сада и приградских насеља.

Предмет одржавања је:

- 1.200 km канализационе мреже од минималног пречника прикључка $\Phi 160$ до колекторских праваца димензија 4m x 2,5m
- 92-е црпне станице канализације
- 3 постројења за пречишћавање отпадних вода.

Прање канализационе мреже свих пречника

За прање канализационе мреже потребна су истовремено два специјална возила. WOMA (возило за прање под притиском) и Сливничар (вакуумско возило које усисава испран садржај).

Посаду сваког од тих возила чине возач и два радника. У 2020. години опрано је 76,50 km канализационе мреже различитих пречника за 1530 сати проведених на терену. Дневно на овом послу распоређено је највише 8 возила.

За подручја без канализационе мреже врши се пражњење септичких јама корисника. За овај посао се користи специјално возило Сливничар, са посадом коју чине возач и два радника. У 2020. години испражњено је 2323 септичке јаме. Дневно на овом послу распоређено је највише 5 возила.

Прање главних канализационих колекторских праваца

За прање главних канализационих колекторских праваца потребна су два специјална возила WOMA и Сливничар. Посаду сваког возила чине возач и два радника. У 2020. години опрано је 5 km главних канализационих праваца за 107 сати проведених на терену. Дневно на овом послу распоређено је највише 4 возила.

Прање сливника и сливничких прикључака


За прање сливника и сливничких прикључака потребно је специјално возило Canal Jet (возило двоструке намене за испирање канализације воденим млазом под високим притиском и за усисавање муљевитог садржаја). Посаду овог возила чине возач и два радника. У 2020. години опрано је 2150 сливника и сливничких прикључака за 524 сати проведених на терену. Дневно на овом послу распоређено је највише 3 возила.

Замена оштећених рамова и поклопаца на шахтовима, замена оштећених рамова и сливничких решетки на сливницима

Сектор канализације располаже са грађевинском оперативом за три независне екипе које раде на терену и састоји се од:

	МЕХАНИЗАЦИЈА
	ПУТАРИ
1	VW-TRANSPORTER
2	IVEKO
3	IVEKO са руком
	КИПЕРИ
1	IVEKO КИПЕР – 2 КОМАДА
	СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА
1	ЈЕТА
2	МИКСЕР - CARMIX
	КОМБИНОВАНЕ МАШИНЕ
1	BAGER JCB 3X – 3 КОМАДА

Табела изведених радова 2020. године је приложена на крају извештаја.

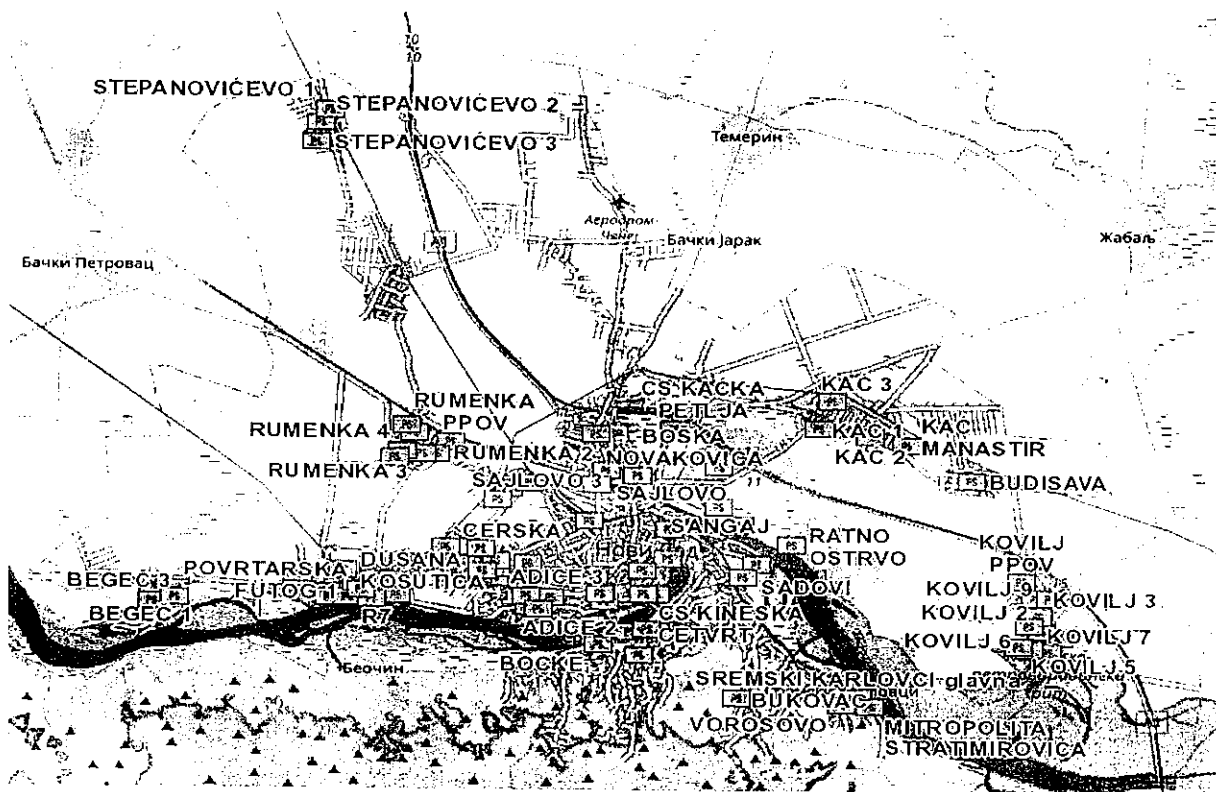

Црпне станице канализације

Прање базена црпних станица канализације

За прање базена црпних станица канализације потребна су два специјална возила WOMA и Сливничар. Посаду сваког возила чине возач и два радника. У 2020. години базени црпних станица канализације су опрани 132 пута за 396 сати проведених на терену.

Пражњење корпи и контејнера са механичким начистоћама на црпним станицама канализације и постројењима за пречишћавање отпадних вода

У 2020. години испражњено је 5408 корпи на црпним станицама канализације и 1635 контејнера на црпним станицама и постројењима за пречишћавање. Утрошено је 1820 сати рада на овај посао. Посаду специјалног возила за пражњење чине један возач и два радника.

Одржавање и редован сервис хидромашинске опреме црпних станица канализације

На 92 црпне станице канализације у непрекидном аутоматском раду је 220 канализационих пумпи распона снаге од 2 киловата до 132 киловата, 27 аутоматска чистача решетки и аутоматска сита за спречавање загушења пумпи. У 2020. години је 97 радних дана утрошено на овај посао. Извршавају га 3 радника која користе камион Застава Турбо Ривал.

Одржавање и редован сервис електро опреме црпних станица канализације

У 2020. години је извршено 2282 обиласка (због превентивног и текућег одржавања) свих црпних станица канализације. На овом послу су ангажоване 3 екипе радника. Једну екипу чине 2 радника и возило VW CITY VAN.

Праћење рада црпних станица канализације путем даљинског надзора

Рад свих црпних станица канализације и постројења за пречишћавање отпадних вода се прати путем даљинског надзора. Ван радног времена дежурне службе електричара сектора канализације и оператера на постројењима за пречишћавање реагују на алармна стања даљинског надзора.

Анализу података даљинског надзора, као превентивног извора информација о систему, у радно време врше 2 радника.

Санација или замена физички хаварисаних делова канализационе мреже, прикључака и шахтова

Сектор канализације радове ове врсте изводи са горе поменутом грађевинском оперативом и радном снагом. За потребе извођења радова већег обима ангажује по уговору треће лице. Табела изведених радова 2020. године је приложена на крају извештаја.

Уклањање механичких препрека у канализационој мрежи, прикључцима и шахтовима; одгушења на мрежи, прикључцима и шахтовима

Одгушења на мрежи

Одгушења на канализационој мрежи спадају у групу интервентних радова. Пријаве загушења примају се позивом на кориснички сервис ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад или директно телефонским позивом служби Функционално одржавање канализационе мреже. По примљеној пријави загушења дежурна екипа, коју чини специјално возило WOMA са припадајућом посадом (возач и два радника), излази на терен и врши одгушење на мрежи. У 2020. години мрежа је одгушена 647 пута за 108 сати проведених на терену. Дневно на овом послу распоређено је највише 2 возила. Рад је организован у две смене радним данима и једној смени викендом и празницима.

Одгушења на прикључцима

Одгушења на канализационим прикључцима спадају у групу интервентних радова. Пријаве загушења примају се позивом на кориснички сервис ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад или директно телефонским позивом служби Функционално одржавање канализационе мреже. По примљеној пријави загушења дежурна екипа, коју чини специјално возило WOMA са припадајућом посадом (возач и два радника), излази на терен и врши одгушење на прикључку. У 2020. години одгушено је 1.107 прикључка за 185 сати проведених на терену. Дневно на овом послу распоређено је највише 2 возила. Рад је организован у две смене радним данима и једној смени викендом и празницима.

Одгушења на шахтовима

Одгушења на канализационим шахтовима спадају у групу интервентних радова. Пријаве загушења примају се позивом на кориснички сервис ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад или директно телефонским позивом служби Функционално одржавање канализационе мреже. По примљеној пријави загушења дежурна екипа, коју чини специјално возило WOMA са припадајућом посадом (возач и два радника), излази на терен и врши одгушење шахта. У 2020. години одгушено је 50 шахтова за 8 сати проведених на терену. Дневно на овом послу распоређено је највише 2 возила. Рад је организован у две смене радним данима и једној смени викендом и празницима.

Отклањање застоја у раду хидромашинске и електроопреме црпних станица канализације

Застоји у раду опреме у 2020. години били су отклањани, без одласка на терен путем даљинског надзора, просечно сат времена дневно радом једног оператера контролно командног центра. Изласцима на терен, у радно време и ван радног времена, извршене су 987 електро и 1477 машинске интервенције. Електро интервенције обавља дежурна електро екипа (2 радника и возило VW CITY VAN), а машинске интервенције 3 радника возилом Турбо Ривал.

Отклањање застоја у раду опреме на постројењима за пречишћавање отпадних вода

У 2020. години оператери на постројењима су 33 пута интервенисали на алармна стања даљинског надзора и отклонили квар. За 15 аларма сложенијих кварова радове је изводио сервисер опреме по уговору за трећа лица.

Интервенције услед већих падавина

Количина атмосферских падавина која треба да се одведе са јавних површина у системе канализације везана је за интензитет падавина. У периоду од 1. маја до 31. августа, у време појаве јаких киша, служба Функционално одржавање канализационе мреже ради у две смене, укључујући

викенде и празнике што подразумева расподелу расположивих возила и радне снаге по принципу пола/пола у свакој смени. Минимални број возила у једној смени је 4. У зависности од врсте проблема на интервенцију се упућују специјална возила Woma, Сливничар или Canal Jet, са припадајућом посадом која подразумева возача и два радника. У 2020. години је било 5 дана са кишом већег интензитета.

Рад интервентних дежурних служби

Сектор Канализација је у току 2020. године поседовао следеће дежурне службе:

- Четири дежурне електро екипе које се смењују по распореду 12/24/12/48, а у саставу једне екипе је 2 радника и возило VW CITY VAN.
- Две дежурне екипе за одгушење канализационе мреже које раде радним данима у две смене по 8 сати, а викендом и празницима у преподневној смени 8 сати. Екипу чини возач, два радника и специјално возило за одгушење WOMA.
- У периоду од 1. маја – 31. августа (када је период учесталих киша) интервентна служба ради у две смене (радним данима, викендом и празницима) са најмање 4 специјална возила.

Табела изведених радова у 2020. години сектора Канализација:

1/1	03.01.2020.		Више локација (набијање)	ВПС
2/1	03.01.2020.	Нови Сад	Живојина Ћулума ЦС Главна Клиса	ХНМ
3/1	08.01.2020.	Нови Сад	Пајевићева 2	СШ
4/1	08.01.2020.	Нови Сад	Љубице Раваси	ХНШ
5/1	09.01.2020.	Нови Сад	Смедеревска 8	ХНП
6/1	09.01.2020.	више локација	Петефи Шандора, Јанка Чмелика ..	набијање
7/1	10.01.2020.	Нови Сад	Сељачких буна 10	РИП
9/1	13.01.2020.	Нови Сад	Булевар Јаше Томића 19 а	ХНШ
10/1	13.01.2020.	Нови Сад	Булевар ослобођења 19	БП
11/1	14.01.2020.	Нови Сад	Стевана Мокрањца 26	РИП
12/1	14.01.2020.	Нови Сад	Булевар Јаше Томића - Гагаринова	РИП
13/1	14.01.2020.	Нови Сад	Јована Поповића 35	РИП
15/1	15.01.2020.	Нови Сад	Индустријска - Руменачка	РИП

16/1	15.01.2020.	Петроварадин	Павла Јуришића Штурма 15	враћање бехатон коцки
17/1	16.01.2020.	Нови Сад	Дечија болница	ХНМ
18/1	16.01.2020.	Нови Сад	Приморска 86	БП
19/1	20.01.2020.	више локација	Каменица, Петроварадин	ВПС
20/1	20.01.2020.	Нови Сад	Петефи Шандора 42	РИП
21/1	21.01.2020.	Нови Сад	Футошки пут - Илариона Руварца	РИП
22/1	22.01.2020.	Нови Сад	Футошки пут 26	ХНШ
23/1	23.01.2020.	Каменица	Карађорђева 6А	ХН еле.кабелу
24/1	23.01.2020.	Нови Сад	Футошки пут 28 б	РИП и ХНШ
25/1	23.01.2020.	Нови Сад	Дунавска 23	РИП
26/1	24.01.2020.	Нови Сад	Школска 1	ХНП
27/1	24.01.2020.	Нови Сад	Которска 45	РИП
28/1	27.01.2020.	Нови Сад	Партизанских база 1	БП
29/1	28.01.2020.	Нови Сад	Угао Приморске и Темеринске	СШ
30/1	28.01.2020.	Нови Сад	Угао Марка Миљанова и Душана Васиљева	Тражење кућне инсталације - прикључка
31/1	29.01.2020.	Нови Сад	Максима Горког 9	ХНП
32/1	29.01.2020.	Нови Сад	Стевана Сремца 13 и 17	ХНШ
33/1	30.01.2020.	Нови Сад	круг предузећа	бетонирање плоча
34/1	30.01.2020.	Нови Сад	Приморска 84	СШ

35/1	31.01.2020.	Нови Сад	1300 каплара 2	ХНП и РИП
36/1	31.01.2020.	Петроварадин	Павла Јуришића Штурма 15	ВПС
37/1	31.01.2020.	Нови Сад	Приморска 84	СШ
38/1	31.01.2020.	Нови Сад	Булевар цара Лазара 50	ХНП
41/2	04.02.2020.	Нови Сад	Сентандрејски пут 78,84,90	ХН вези сливника
42/2	04.02.2020.	Петроварадин	Динка Шимуновића 42А - 44	Тражење преасфалтираних шахтова
44/2	06.02.2020.	Нови Сад	Приморска 84А (Аптив)	РИП
45/2	06.02.2020.	Нови Сад	Угао Приморске и Темеринске х 2 ком	РИП
46/2	06.02.2020.	Нови Сад	Хајдук Вељкова 12 (Круг Дечије болнице)	РИП
51/2	11.02.2020.	Нови Сад	Булевар Јована Дучића 26	ХНМ
52/2	11.02.2020.	Нови Сад	Приморска (преко пута броја 28)	БП
53/2	11.02.2020.	Нови Сад	Ритска (преко пута школе)	БП
54/2	13.02.2020.	Нови Сад	Три багрема 13	РИП
57/2	14.02.2020.	Нови Сад	Новосадски пут 157	СШ
58/2	14.02.2020.	Нови Сад	Богобоја Атанацковића 14	РИП
59/2	14.02.2020.	Нови Сад	Краљевића Марка 43	СШ
60/2	14.02.2020.	Нови Сад	Жарка Васиљевића 6	ХНП
61/2	14.02.2020.	Нови Сад	Угао Булеvara кнеза Милоша и Булеvara војводе Степе	БП
62/2	14.02.2020.	Ветерник	Иве Лоле Рибара 3	БП

64/2	18.02.2020.	више адреса	Раковачка 63, Радна зона Север 4, Јожеф Атиле 7.....	набијање
65/2	18.02.2020.	Нови Сад	Браће Дроњак 7	БП
66/2	19.02.2020.	Нови Сад	Приморска (Од Сентандрејског пута до Темеринске)	РИП x 11ком
67/2	19.02.2020.	Ветерник	Иве Лоле Рибара 3	РИП
70/2	21.02.2020.	Нови Сад	Пап Павла 39-41	ХНШ
71/2	21.02.2020.	Ветерник	Новосадски пут 113	РИП, ХНШ
72/2	21.02.2020.	Нови Сад	Боже Кузмановића 2	РИП
73/2	21.02.2020.	Нови Сад	Зрењанински пут 10	ХНП
76/2	24.02.2020.	Нови Сад	Булевар краља Петра 21	БП
77/2	25.02.2020.	Нови Сад	Живка Радовановића 3	ХНШ
78/2	25.02.2020.	Петроварадин	Тврђава код академије	РИП
79/2	25.02.2020.	Нови Сад	Булевар краља Петра 21	РИП
80/2	25.02.2020.	Нови Сад	Булевар краља Петра - Париске комунае	СШ
81/2	25.02.2020.	Нови Сад	Париске комунае 19	РИП x 2
82/2	25.02.2020.	Нови Сад	Париске комунае 21	РИП
83/2	25.02.2020.	Нови Сад	Мише Димитријевића 11	ХНП
84/2	26.02.2020.	Нови Сад	Змај Јовина 19	ХНП
85/2	26.02.2020.	Нови Сад	Стојана Новаковића 13	ХНП
86/2	26.02.2020.	Нови Сад	Милана Јанића ББ	РИП x 5

87/2	26.02.2020.	Нови Сад	круг Предузећа	бетонирање плоча
88/2	27.02.2020.	Адице	магацин	постављање стубића
91/2	28.02.2020.	Нови Сад	Булевар кнеза Милоша 13	БП
92/2	28.02.2020.	Нови Сад	Браће Дроњак 7	БП
93/2	28.02.2020.	Нови Сад	Војводе Степе-Кнеза Милоша	РИП
2/3	02.03.2020.	Нови Сад	Анта Станичића 2	ХНП
3/3	02.03.2020.	Нови Сад	Владимира Перића Валтера 5	БП
4/3	03.03.2020.	Нови Сад	Раше Радујкова 12	ХНМ и ХНШ
5/3	03.03.2020.	Нови Сад	Змај Јовина 19	ВПС
6/3	02.03.2020.	Нови Сад	Стојана Новаковића 13-15	ХНШ
7/3	05.03.2020.	Нови Сад	Владимира Перића Валтера 4	ХНП
8/3	05.03.2020.	Нови Сад	Булевар кнеза Милоша 13	РИП x 3
9/3	05.03.2020.	више адреса	Павла Јуришића 15, Ћирила и Методија 4...	ВПС
10/3	06.03.2020.	Футог	Цара Лазара 24	РИП
11/3	06.03.2020.	Нови Сад	Трг Марије Трендафил 14 (7)	ХНМ
12/3	09.03.2020.	Нови Сад	Новосадски пут 113	ХНШ и РИП
13/3	10.03.2020.	Нови Сад	Трг Марије Трендафил 14 (7)	ХНМ
14/3	11.03.2020.	Нови Сад	Трг Марије Трендафил 14 (7)	ВПС
15/3	12.03.2020.	Нови Сад	Бајчи Жилинског код Темпа	РИП
16/3	12.03.2020.	Петроварадин	Вере Мишчевић 20	РИП

17/3	12.03.2020.	Нови Сад	Ђаконa Авакума- Стевана Тодоровића	БП
18/3	16.03.2020.	Нови Сад	Народних хероја 3	РИП
20/3	16.03.2020.	Ковиљ	Стевана Пешића 44	бетонирање
23/3	17.03.2020.	Нови Сад	Омладинских радних акција- Паје Радосављевића	БП
24/3	19.03.2020.	Нови Сад	Масарикова	бетонирање
25/3	23.03.2020.	Нови Сад	Булевар патријарха Павла 20	ХНМ- ХНП
26/3	24.03.2020.	Нови Сад	Омладинског покрета 7	БП
27/3	26.03.2020.	Нови Сад	Омладинског покрета 7	РИП
28/3	27.03.2020.	Нови Сад	Булевар кнеза Милоша - Јована Дучића	РИП
29/3	30.03.2020.	Каменица	Железничка-пекара Маја	ВПС
30/3	31.03.2020.	Нови Сад	Масарикова	ВПС
1/4	02.04.2020.	Нови Сад	Новосадски пут – Шумска	СШ
2/4	03.04.2020.	Нови Сад	Вршачка 2	РИП
3/4	07.04.2020.	Нови Сад	Булевар ослобођења 153	СШ
4/4	08.04.2020.	Нови Сад	Балзакова 16-18	РИП x 2
5/4	09.04.2020.	Нови Сад	Омладинског покрета 2	ХНМ
6/4	09.04.2020.	Нови Сад	Которска 75	ХНП
7/4/1	09.04.2020.	Нови Сад	Балзакова преко бр.2	РИП
8/4	16.04.2020.	Нови Сад	Темеринска 67 и 89	СШ x 2
9/4	16.04.2020.	Нови Сад	Максима Горког 41	ХНМ
10/4	16.04.2020.	Нови Сад	Пастерова преко бр. 4	БП

11/4	21.04.2020.	Нови Сад	Темеринска - Пут шајкашког одреда	ВПС
12/4	22.04.2020.	Нови Сад	Радничка 43	РИП
13/4	22.04.2020.	Нови Сад	Радничка 41	ХНМ
14/4	21.04.2020.	Нови Сад	Максима Горког 41	ВПС
15/4	23.04.2020.	Нови Сад	Дунавска 23	ХНП
16/4	24.04.2020.	Нови Сад	Дунавска 23	ВПС
17/4	24.04.2020.	Нови Сад	Зрењанински пут пумпа Авиа	СШ
18/4	27.04.2020.	Петроварадин	Дунавских дивизија наспрам гробља	СШ
19/4	28.04.2020.	Петроварадин	Дунавских дивизија 3 а	СШ
20/4	28.04.2020.	Нови Сад	Балканска 2	БП
22/4	29.04.2020.	Петроварадин	Фрање Штефановића 8	БП
23/4	30.04.2020.	више адреса	Петроварадин, Ивана Кочија, а.-Станчића	ВПС
1/5	04.05.2020.	Нови Сад	Алмашка - Пећка	ХНМ
2/5	05.05.2020.	Нови Сад	Темеринска 24	НСР
7/5	11.05.2020	Нови Сад	Рудничка - Илије Гарашанина	РИП
8/5	11.05.2020.	Нови Сад	Димитрије Аврамовић 5	ХНШ
9/5	11.05.2020.	Ветерник	Книнска 54	ХНП
12/5	13.05.2020.	Ветерник	Николе Михајовића 27	ХНП
13/5	13.05.2020.	Нови Сад	Петра Кочића 12	ХНМ
14/5	13.05.2020.	Нови Сад	Булевар ослобођења 18 иза Максија	БП

15/5	13.05.2020.	Нови Сад	Ритска (преко пута школе)	БП x 2
17/5	14.05.2020.	Нови Сад	Илариона Руварца 31	РИП
18/5	14.05.2020.	Нови Сад	Јована Дучића 2-4	РИП
19/5	14.05.2020.	Нови Сад	Стевана Мокрањца 20	РИП
21/5	15.05.2020.	Нови Сад	Булевар ослобођења-Д. Брашована	ХНС
24/5	18.05.2020.	Нови Сад	Булевар кнеза Милоша 2	ХНМ
26/5	19.05.2020.	Нови Сад	Фрање Штефановића 3	РИП
27/5	19.05.2020.	Нови Сад	Железничка колонија 17а	РИП
28/5	19.05.2020.	Нови Сад	Др. Јована Андрејевића 2	БП
31/5	20.05.2020.	Шангај	3 улица 77	БП
33/5	21.05.2020.	Нови Сад	Ференца Фехера 5	ХНП
34/5	21.05.2020.	Нови Сад	Милана Јањића бб	БП
35/5	21.05.2020.	Нови Сад	Браће Могин преко 20	БП
36/5	22.05.2020.	Нови Сад	Војвођанских бригада-М. Јакшића	РИП
37/5	25.05.2020.	Нови Сад	Јована Дучића	БП
38/5	25.05.2020.	Нови Сад	Облачића Рада	БП
39/5	25.05.2020.	Футог	Марије Бурсаћ 3	ХНП
40/5	25.05.2020.	више адреса		ВПС
42/5	26.05.2020.	Нови Сад	Привредникова 3	РИП
45/5	28.05.2020.	Нови Сад	Народних хероја 71	БП
46/5	28.05.2020.	Нови Сад	Алексе Шантића 19	БП

48/5	29.05.2020.	Нови Сад	Ћирила и Методија 144	РИП
49/5	29.05.2020.	Нови Сад	Народног фронта 144	РИП
50/5	29.05.2020.	Нови Сад	Коло српских сестара - Цара Лазара	СШ
51/5	29.05.2020.	Футог	Сремска - Рибарска	БП
52/5	29.05.2020.	Нови Сад	Филтер	БП x 2
53/5	30.05.2020.	Нови Сад	Београдски кеј 9	ХНМ
1/6	01.06.2020.	Степановићево	Његошева 2	ХНШ и РИП
2/6	01.06.2020.	више адреса		ВПС
3/6	01.06.2020.	Нови Сад	Петра Драпшина бб	БП
7/6	05.06.2020.	Нови Сад	Партизанских база 10	РИП
8/6	05.06.2020.	Нови Сад	Петра Дрезгића 19	РИП
9/6	05.06.2020.	Нови Сад	Ђорђа Рајковића 38	РИП
10/6	05.06.2020.	Ветерник	Војводе Бојовића	БП
11/6	05.06.2020.	Нови Сад	Булевар Јаше Томића преко бр.13	БП
12/6	08.06.2020.	Нови Сад	Радничка 43	ХНМ
13/6	08.06.2020.	Нови Сад	круг Предузећа	бетонирање плоча
14/6	08.06.2020.	Нови Сад	Балзакова 19	ХНП
15/6	09.06.2020.	Нови Сад	Пут шајкашког одреда	РИП x 4

16/6	05.06.2020.	Ветерник	Драгослава Срејовића - Соње Маринковић	РИП
18/6	10.06.2020.	Нови Сад	Јосифа Маринковић 33	ХНМ
19/6	10.06.2020.	Нови Сад	Београдски кеј	БП
20/6	11.06.2020.	Нови Сад	Петра Дрезгића 21-33	РИП x 4
21/6	12.06.2020.	Нови Сад	Београдски кеј 47	РИП
22/6	12.06.2020.	Каменица	Др Бранка Манојловића 20 а	РИП
23/6	15.06.2020.	Нови Сад	Пут шајкашког одреда	РИП x 3
24/6	13.06.2020.	Петроварадин	Подунавског одреда 6	ХНП
25/6	12.06.2020.	Нови Сад	Браће Поповић 3	ХНП
26/6	15.06.2020.	више адреса	Б.Бајића, Морнарска 37, Беле њиве 30, Радничка 43, Бул. Ослобођења	ВПС
27/6	16.06.2020.	Нови Сад	Београдски кеј-М. Миљанова	РИП x 2
28/6	16.06.2020.	Нови Сад	Булевар Јаше Томића преко бр.13	РИП
30/6	17.06.2020.	Нови Сад	Дожа Ћерђа 19	ХНС
31/6	17.06.2020.	Нови Сад	Драгише Брашована 4	ХНШ
33/6	18.06.2020.	Нови Сад	Душана Васиљева 15	ХНП
34/6	22.06.2020.	Нови Сад	Руменачка 133	БП

35/6	22.06.2020.	Нови Сад	Сентандрејски пут 80 и 84	БП x 2
36/6	23.06.2020.	Нови Сад	Његошева 11	ХНП
37/6	23.06.2020.	Ср. Каменица	Наде Љубојевић Тихе 9-10	РИП
38/6	23.06.2020.	Ветерник	Светозара Марковића Тозе 40-42	РИП
39/6	24.06.2020.	Нови Сад	Дожа Ћерђа 21-23	СШ
40/6	24.06.2020.	Нови Сад	Душана Васиљева 8	ХНМ
41/6	24.06.2020.	Нови Сад	Гајева 22	СШ
42/6	24.06.2020.	Нови Сад	Више адреса	ВПС
43/6	24.06.2020.	Нови Сад	Балзакова 43	БП
45/6	25.06.2020.	Нови Сад	Народног фонта 73	БП
46/6	26.06.2020.	Ветерник	Проке Јовкића 14	ХНП
50/6	30.06.2020.	Ср. Каменица	Војводе Путника 26	ХНШ
51/6	30.06.2020.	Нови Сад	Серво Михаља 11	РИП
52/6	30.06.2020.	Ср. Карловци	Матошева 70	ХНП
2/7	01.07.2020.	Ветерник	Краља Александра 75	ХНП
3/7	01.07.2020.	Каћ	Шумадијска 75	ХНП

4/7	02.07.2020.	Нови Сад	Лазе Нанчића 49	ХНМ
5/7	02.07.2020.	Нови Сад	Угао Бул.војводе Степе и Бул.кнеза Милоша	РИП
6/7	02.07.2020.	Нови Сад	Бранка Ћопића 80	РИП
7/7	02.07.2020.	Петроварадин	Угао Лисинског и Проте Михалџића	ХНП
8/7	03.07.2020.	Нови Сад	Бул. Јована Дучића 21	ХНШ
9/7	03.07.2020.	Нови Сад	Више адреса	ВПС
11/7	06.07.2020.	Нови Сад	Душана Васиљева 15	ВПС
12/7	06.07.2020.	Нови Сад	Бул Јована Дучића наспрам броја 15	БП
13/7	07.07.2020.	Ветерник	Радничка 26	ХНП
14/7	07.07.2020.	Нови Сад	Банатска 8	РИП
15/7	07.07.2020.	Нови Сад	Булевар ослобођења 94	СШ
17/7	07.07.2020.	Нови Сад	Момчила Тапавице 10	БП
18/7	08.07.2020.	Нови Сад	ЦС Клиса	Санација потиса
19/7	08.07.2020.	Нови Сад	Бановић Страхиње 10-12	ХНМ
20/7	08.07.2020.	Петроварадин	Динка Шимуновића	РИП тражење
21/7	09.07.2020.	Нови Сад	Јована Поповића 19	РИП

22/7	09.07.2020.	Нови Сад	Бранка Ћопића 80	РИП
23/7	09.07.2020.	Нови Сад	Темерински пут 81	БП
24/7	10.07.2020.	Нови Сад	Угао Паје Радосављевића и Омладинских радних акција	РИП
25/7	10.07.2020.	Нови Сад	Јована Бошковића 1	ХНП
26/7	10.07.2020.	Нови Сад	Јована Бошковића 13	ХНП
28/7	13.07.2020.	Нови Сад	Вршачка - Дубровачка	РИП
29/7	13.07.2020.	Нови Сад	Миленка Грчића 19а	ХНП
30/7	14.07.2020.	Нови Сад	Алмашка 9	БП
34/7	13.07.2020.	Нови Сад	Трг слободе 1	СШ
35/7	17.07.2020.	Нови Сад	Миленка Грчића 23	РИП x 3
36/7	21.07.2020.	Петроварадин	Плато РТВ	РИП x 3
37/7	22.07.2020.	Каменица	Мишелук 1	БП
38/7	24.07.2020.	Футог	Раде Кондића 137	БП
39/7	24.07.2020.	Нови Сад	Мичуриноваа 52	РИП x 2
40/7	27.07.2020.	Нови Сад	Пушкинова 3	РИП x 3
41/7	27.07.2020.	Нови Сад	Ћирила и Методија 144	РИП

42/7	27.07.2020.	Нови Сад	Алмашка 9	РИП
43/7	27.07.2020.	Каменица	Бранислава Букурова	Тражење преасфалтираних шахтова
44/7	27.07.2020.	Нови Сад	Ференца Фехера 6	ХНП
45/7	27.07.2020.	Нови Сад	ГЦ 1	ХНС
46/7	27.07.2020.	Нови Сад	ГЦ 1	замена цеви
48/7	28.07.2020.	Нови Сад	Мише Димитријевића -Пушкинова	РИП
49/7	28.07.2020.	Нови Сад	Руменачка 150 а	СШ
50/7	28.07.2020.	Степановићево	Војводе Степе 92	бетонирање
51/7	29.07.2020.	Нови Сад	Дубровачка 2	ХВС
52/7	29.07.2020.	Нови Сад	Косте Рацина 10	ХНШ
53/7	29.07.2020.	Нови Сад	Партизанских база 8	РИП
54/7	29.07.2020.	Футог	Цара Лазара 141	РИП
55/7	30.07.2020.	Нови Сад	Златне греде 18	ХНМ
56/7	30.07.2020.	Каменица	Железничка 9	РИП
57/7	30.07.2020.	Каменица	Бранислава Букурова	ХНМ
60/7	31.07.2020.	Каменица	Мишелук 1	ХНС

1/8	03.08.2020.	Нови Сад	Михајла Пупина 3	ХНМ
3/8	03.08.2020.	Нови Сад	Алберта Томе 6	поклопац
4/8	03.08.2020.	Нови Сад	Темерински пут 89	поклопац
5/8	04.08.2020.	више адреса		ВПС
7/8	06.08.2020.	Нови Сад	Златне греде 25	ХНМ
9/8	10.08.2020.	Нови Сад	Тараса Шевченка 2	ХНМ, ХНШ
10/8	11.08.2020.	Нови Сад	Војводе Мишића 1	ХНШ
11/8	11.08.2020.	Нови Сад	Димитрија Аврамовића 9-11	ХНШ
12/8	13.08.2020.	Нови Сад	Војводе Мишића 32	ХНМ
13/8	14.08.2020.	Нови Сад	Которска 81	РИП
14/8	14.08.2020.	Нови Сад	Тараса Шевченка 2	ХНП
15/8	14.08.2020.	више адреса		ВПС
17/8	18.08.2020.	Буковац	Видовданска 17	ХНМ
19/8	21.08.2020.	Нови Сад	Јована Бошковића- С. Брановачког	ХНС
20/8	21.08.2020.	Нови Сад	Булевар Јаше Томића бр.13 б	БП
22/8	19.08.2020.	Нови Сад	Београдски кеј 41	ХНМ

23/8	25.08.2020.	Нови Сад	Фрушкогорска 16	БП
24/8	25.08.2020.	Нови Сад	Антон Урбана 15а	БП
26/8	27.08.2020.	Каменица	М. Стојадиновић српкиње 8	ХНП
27/8	27.08.2020.	Ветерник	19 маја 22а	поклопац
29/8	28.08.2020.	Каменица	Иве Лопе Рибара 50	БП
31/8	31.08.2020.	Нови Сад	Надежде Петовић 4	БП
1/9	02.09.2020.	више локација		ВПС
3/9	04.09.2020.	Нови Сад	Београдски кеј 41	ХНП
6/9	08.09.2020.	више локација		ВПС
7/9	08.09.2020.	Шангај	IV бр. 38 - VI улица	БП
8/9	08.09.2020.	Нови Сад	Саве Ковачевића 12	РИП
10/9	09.09.2020.	Нови Сад	Саве Вуковића 12	РИП
11/9	09.09.2020.	Нови Сад	Которска 81	РИП
12/9	09.09.2020.	Нови Сад	Ненада Митрова 10	ХНП
13/9	10.09.2020.	Нови Сад	Фочанска - Змајевачки пут	СШ
14/9	10.09.2020.	Нови Сад	Фрушкогорска 16	РИП

15/9	10.09.2020.	Ветерник	Војводе Бојовића 2	РИП
16/9	10.09.2020.	Нови Сад	Илирска - Футошки пут	ХНМ
18/9	11.09.2020.	Нови Сад	Јернеја Копитара 43	бетонирање
20/9	14.09.2020.	Нови Сад	Теодора Павловића 28	ХНШ
21/9	14.09.2020.	Нови Сад	Мајевичка 4	СШ
22/9	14.09.2020.	Нови Сад	Петра Кочића 2	ХНП
23/9	14.09.2020.	Нови Сад	Боже Кузмановића 21-А. Максимовића	БП
25/9	15.09.2020.	Нови Сад	Максима Горког 9	ХНП
26/9	15.09.2020.	Нови Сад	Париске комуне 29	БП
27/9	15.09.2020.	Петроварадин	Округлићева 28	БП
28/9	16.09.2020.	Нови Сад	Балзакова 47-49	БП
29/9	16.09.2020.	Буковац	Бранка Радичевића 12а	ХНШ
30/9	16.09.2020.	Нови Сад	Веселина Маслеше 5	СШ x 2
31/9	16.09.2020.	Нови Сад	Максима Горког 27	ХНП
33/9	17.09.2020.	Нови Сад	Јована Бошковића 13	ХНП
34/9	21.09.2020.	Нови Сад	Раваничка 7	ХНШ ХНМ

35/9	21.09.2020.	више локација		ВПС
36/9	21.09.2020.	Ковиљ	Бранка Радичевића 28	бетонирање
37/9	21.09.2020.	Нови Сад	Јована Бошковића 1	бетонирање
38/9	21.09.2020.	Нови Сад	Иве Андрића 25	ХНС
40/9	22.09.2020.	Нови Сад	Јована Храниловића 38	поправка дела прикључка
41/9	23.09.2020.	Нови Сад	ЦС Главна Клиса	ВПС
42/9	23.09.2020.	Ветерник	ЦС 10 Ветерник	крчење приступног пута
43/9	23.09.2020.	Нови Сад	Косте Абрашевића 51	РИП x 2
44/9	23.09.2020.	Нови Сад	Др Јована Андрејевића 22	РИП
45/9	23.09.2020.	Нови Сад	Футошки пут 34	РИП
46/9	24.09.2020.	Карловци	Доситеја Обрадовића 35	РИП
47/9	24.09.2020.	Петроварадин	Прерадовићева 51а	СШ
48/9	24.09.2020.	Нови Сад	Булевар кнеза Милоша-Булевар војводе Степе	СШ
49/9	24.09.2020.	више локација	Јанка Чмелика 11, Теодора Павловића 28, Неимарова 38, Ј. Храниловића 39	ВПС
50/9	24.09.2020.	Нови Сад	Крфска 9	БП
52/9	25.09.2020.	Буковац	Бранка Радичевића 12а	бетонирање

53/9	25.09.2020.	Нови Сад	Жарка Зрењанина 2	ХНШ
55/9	28.09.2020.	Нови Сад	Народног фронта 2-4	ХНШ
56/9	28.09.2020.	Нови Сад	Которска 81	РИП
57/9	29.09.2020.	Нови Сад	Модене- Илије Огњановића	ХНМ
58/9	29.09.2020.	Каменица	Железничка-Змај јовина код пекаре Маја	ХНРИП
59/9	29.09.2020.	Нови Сад	Тицанова 35	РИП
60/9	30.09.2020.	Нови Сад	Бајчи Жилинског	РИП x 5
61/9	30.09.2020.	више локација	ВПС	
1/10	01.10.2020.	Нови Сад	Цетињска 31-33	ХНШ
2/10	01.10.2020.	Футог	Цара Лазара 191	РИП
3/10	01.10.2020.	Футог	Републике српске- Индустијска	ХНШ
4/10	02.10.2020.	Нови Сад	Јована Бошковића 1	разваљивање тротоара
6/10	02.10.2020.	Нови Сад	Трг младенаца 1	РИП
7/10	05.10.2020.	Нови Сад	Зличићева	бетонирање плоча
8/10	05.10.2020.	више локација	Цетињска 31-33, Петефи Шандора 151 а	ВПС
9/10	06.10.2020.	Нови Сад	Угао Бул. Ослобођења-Краља Петра	нивелисање СШ

10/10	06.10.2020.	Нови Сад	Футошка 38-50	ХНС
11/10	07.10.2020.	Нови Сад	Патријарха Чарнојевића преко пута бр. 9	ХНП
12/10	07.10.2020.	Карловци	Ивана Мажуранића 32	РИП
13/10	07.10.2020.	Каменица	Железничка	ХНШ дихтовање поклопца
14/10	08.10.2020.	Нови Сад	Фрушкогорска 6	РИП
15/10	08.10.2020.	Ветерник	Светозара Милетића 59	РИП
16/10	08.10.2020.	Нови Сад	Јована Дучића наспрам 15	РИП
17/10	08.10.2020.	Нови Сад	Руменачка 133	РИП
18/10	08.10.2020.	Нови Сад	Булевар краља Петра код Максија	нивелисање СШ и тела сливника
19/10	08.10.2020.	Ветерник	Новосадски пут 3-157	ХНС
21/10	09.10.2020.	Петроварадин	Подунавског одреда 12	ХНП
22/10	09.10.2020.	Нови Сад	Париске комуне 42	ХНМ
23/10	12.10.2020.	Нови Сад	Стефана Стефановића-Шафарикова	ХНП
24/10	12.10.2020.	Нови Сад	Бранка Радичевића 15	ХНП
25/10	12.10.2020.	Ветерник	Новосадски пут 65-69	РИП
26/10	14.10.2020.	Нови Сад	Барањска 5а	ХНП

27/10	15.10.2020.	Нови Сад	Шекспирова иза студенског дома	СШ
28/10	15.10.2020.	Нови Сад	Павла Папа 29	РИП
29/10	15.10.2020.	Карловци	Јове Ј. Змаја 18	РИП x 2
30/10	15.10.2020.	Нови Сад	Београдски кеј код дома војске	СШ и РИП
32/10	16.10.2020.	Нови Сад	Змајевачки пут 62	БП
33/10	16.10.2020.	Нови Сад	Ћирила и Методија 62	СШ
34/10	16.10.2020.	Нови Сад	Облачића Рада 35	ХНП
35/10	16.10.2020.	Нови Сад	Војводе Степе 15	БП
36/10	19.10.2020.	више локација	П. Павла, Барањска 5а, П. Чарнојевића 9	ВПС
37/10	19.10.2020.	Нови Сад	Крфска 9	РИП
38/10	19.10.2020.	Нови Сад	Војводе Степе 15	РИП
39/10	19.10.2020.	Нови Сад	Сентандрејски пут 80-84	РИП x 2
40/10	20.10.2020.	Нови Сад	Кисачка 65	СШ
41/10	20.10.2020.	Нови Сад	Бате Бркића 32-34	СШ
42/10	20.10.2020.	Нови Сад	Круг предузећа	бетонирање плоча
43/10	20.10.2020.	Нови Сад	Сунчани кеј	ХНП

43/10/1	21.10.2020.	Ветерник	Војводе Бојовића 51	БП
44/10	21.10.2020.	Нови Сад	Саве Ковачевића 2,4,6	РИП х 3ком
45/10	22.10.2020.	Степановићево	ППОВ Степановићево	Бетонирање прилаза
46/10	22.10.2020.	Нови Сад	Круг предузећа	бетонирање плоча
47/10	23.10.2020.	Нови Сад	Париске комуне 42	ВПС
48/10	23.10.2020.	Нови Сад	Фејеш Кларе преко пута бр 66	Веза сливника
49/10	23.10.2020.	Нови Сад	Булевар Слободана Јовановића 13	БП
51/10	26.10.2020.	Нови Сад	Угао Бул. краља Петра I и Саве Ковачевића	ХНМ
52/10	27.10.2020.	Петроварадин	Угао Динка Шимуновића и Рачког	ХНШ
53/10	27.10.2020.	Нови Сад	Надежде Петровић 4	БП
54/10	27.10.2020.	Нови Сад	Ива Андрића 17	БП
55/10	28.10.2020.	Нови Сад	Надежде Петровић 4	РИП
56/10	28.10.2020.	Нови Сад	Булевар Слободана Јовановића 13	РИП
57/10	29.10.2020.	Нови Сад	Бајчи Жилинског (пењање на аутопут)	РИП
58/10	29.10.2020.	Нови Сад	Угао Земљане Ћуприје и Милана Ракића	РИП
59/10	30.10.2020.	Ковиљ	Лазе Костића 93	ВПС

о60/10	30.10.2020.	Нови Сад	Круг предузећа	Бетонирање стубића
1/11	02.11.2020.	Нови Сад	Мирослава Продановића Мицка 3	СШ
2/11	02.11.2020.	Нови Сад	Булевар Михајла Пупина 1	СШ
3/11	02.11.2020.	Нови Сад	Угао Љубомира Ненадовића и Мирослава Продановића Мицка	БП x 2 ком.
4/11	02.11.2020.	Петроварадин	Угао Динка Шимуновића и Рачког	ВПС (набијање)
6/11	03.11.2020.	Нови Сад	Анђе Ранковић 6	ХНМ
7/11	04.11.2020.	Нови Сад	Руменачка 108	ХНШ
8/11	04.11.2020.	Нови Сад	Булевар Јаше Томића 13	РИП
9/11	04.11.2020.	Нови Сад	Темерински пут 91	РИП
10/11	04.11.2020.	Нови Сад	Шајкашка 15А	ВПС (набијање)
14/11	06.11.2020.	Нови Сад	Шумадијска 18	БП
16/11	09.11.2020.	Нови Сад	Париске комуне 42	ВПС (бетонирање)
18/11	10.11.2020.	Ср. Каменица	Војводе Мишића 2	ВПС
18/11	10.11.2020.	Нови Сад	Достојевског 15	ВПС
20/11	12.11.2020.	Ср. Каменица	Војводе Мишића 2	ВПС
20/11	12.11.2020.	Нови Сад	Достојевског 15	ВПС

21/11	12.11.2020.	Ср. Каменица	Др Голдмана(од Ауто куће Петровић до Семафора - разделно острво)	БП (2 комада)
22/11	13.11.2020.	Нови Сад	Угао Змајевачког пута и Милке Марковић	РИП
24/11	16.11.2020.	Нови Сад	Угао Футошког пута и Булевара Европе	СШ
27/11	17.11.2020.	Нови Сад	Пушкинова 18	ХНМ
28/11	20.11.2020.	Нови Сад	Стевана Дивнина Бабе 14	БП
29/11	20.11.2020.	Ветерник	Рузмаринова 17	РИП
30/11	20.11.2020.	Нови Сад	Душана Даниловића 38	ХНП
31/11	23.11.2020.	Нови Сад	Светојованска 3	ВПС
34/11	24.11.2020.	Нови Сад	Булевар ослобођења 115	СШ
35/11	24.11.2020.	Нови Сад	Угао Велебитске и Боже Кузмановића	РИП
38/11	26.11.2020.	Нови Сад	Раде Смиљанова 11	БП
39/11	27.11.2020.	више локација		ВПС
40/11	25.11.2020.	Нови Сад	Кружна 18	РИП
42/11		више локација		ВПС
3/12	02.12.2020.	Нови Сад	Динка Шимуновића	Насипање шљунка на тражене рипове
5/12	03.12.2020.	више локација		ВПС

6/12	03.12.2020.	Нови Сад	Савска 4	БП
7/12	04.12.2020.	више локација		ВПС
8/12	04.12.2020.	Нови Сад	Савска 4	РИП
14/12	09.12.2020.	више локација		ВПС
16/12	10.12.2020.	Нови Сад	Булевар Европе 1	ХНШ
17/12	10.12.2020.	Футог	Цара Лазара ББ (6308/2)	ВПС
18/12	11.12.2020.	Нови Сад	Гагаринова 10Ћ	РИП
19/12	11.12.2020.	Ср. Каменица	Железничка 17	РИП
20/12	11.12.2020.	Футог	Цара Лазара ББ (6308/2)	ВПС
22/12	14.12.2020.	више локација		ВПС
25/12	16.12.2020.	Нови Сад	Угао Браће Могин и Филипа Филиповића	ХНМ
26/12	16.12.2020.	Нови Сад	Темеринска 91	РИП
28/12	17.12.2020.	више локација		ВПС
29/12	17.12.2020.	Нови Сад	Бранимира Ћосића 31	поклопац (сечен)
32/12	21.12.2020.	Нови Сад	Змај Јовина - Владичански двор	ХНМ
34/12	22.12.2020.	Ср. Карловци	Јована Јовановића Змаја 18	РИП
35/12	22.12.2020.	више локација		ВПС
36/12	22.12.2020.	Нови Сад	Бате Бркића 28	Поклопац (сечен)

38/12	23.12.2020.	Ветерник	Краља Александра (испред вртића)	РИП
40/12	24.12.2020.	Нови Сад	Угао Бул. војводе Степе и Бул. кнеза Милоша	СШ
41/12	24.12.2020.	више локација		ВПС (набијање)
43/12	25.12.2020.	Нови Сад	Пећка 12	ХНП
45/12	28.12.2020.	више локација		ВПС (набијање)
47/12	29.12.2020.	Нови Сад	Вука Караџића 12	ХНМ
49/12	30.12.2020.	Петроварадин	Округићева 26	РИП
50/12	31.12.2020.	Нови Сад	Браће Дроњак 12-14	БП
51/12	28.12.2020.	Петроварадин	Прерадовићева 33	РИП
52/12	28.12.2020.	Нови Сад	Петефи Шандора 85	ХНП

Скраћеница за врсту рада	Значење скраћенице
ХНМ	Хаварија на канализационој мрежи
ХНП	Хаварија на канализационом прикључку
ХНШ	Хаварија на канализационом шахту
ХНС	Хаварија на телу сливника
РИП	Замена рама и поклопца на канализационом шахту
СШ	Замена сливничке решетке
БП	Изношење бетонске плоче
НРИП	Нивелисање рама и поклопца на канализационом шахту
НСР	Нивелисање сливничке решетке
ВПС	Враћање раскопане површине у првобитно стање



Директор

ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад

Гвозден Перковић

март 2021. године
