

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:352-1/2025-134-II
Дана: 10. јуна 2025. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2024. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, за период 1. јануар – 31. децембар 2024. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2025-134-II од 10. јуна 2025. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2024. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, за период 1. јануар – 31. децембар 2024. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Жарко Мићин

У складу са чланом 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2024. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, за период 1. јануар – 31. децембар 2024. године, Градско веће Града Новог Сада, на 27. седници од 10.06. 2025. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2024. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, за период 1. јануар – 31. децембар 2024. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад усвојио на 1. седници одржаној 24. марта 2025. године и предлаже се Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2024. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, за период 1. јануар – 31. децембар 2024. године."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Данијела Андрић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2025-134-II
Дана: 10.06.2025. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Марко Мићин
Норс

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада је на XLVI седници од 7. децембра 2023. године, донела Решење о давању сагласности на Одлуку о Програму инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2024. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/23) који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад донео на 25. седници, одржаној 27. новембра 2023. године.

Чланом 5. наведеног програма дефинисано је да Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада годишњи извештај о реализацији Програма, са исказаним физичким и финансијским показатељима о извршеним активностима и утрошку средстава.

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2024. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, за период 1. јануар – 31. децембар 2024. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад усвојио на 1. седници одржаној 24. марта 2025. године.

За реализацију наведеног програма планирана су средства Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад у износу од 157.500.000,00 динара, од чега се 61.500.000,00 динара односи на инвестициона улагања, а 96.000.000,00 динара на текуће одржавање водовода и канализације.

II. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

ВОДОВОД

Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 1 на изворишту Штранд у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације уговорених обавеза

На основу спроведеног поступка јавне набавке дана 29. маја 2023. године закључен је уговор са ГП „Градитељ НС“ д.о.о. из Новог Сада на укупну вредност од 34.996.060,30 динара. Уговорени рок за извођење радова је 90 календарских дана. Извођач радова је уведен у посао дана 26. јуна 2023. године и наредног дана 27. јуна 2023. године радови су обустављени због повећане потрошње воде, како у летњем тако и у јесењем периоду. Радови на реконструкцији опреме настављени су 29. јануара 2024. године. Због наведене обуставе радови се нису могли реализовати планираном динамиком, те је анексом уговора од 2. априла 2024. године продужен уговорени рок извођења радова за 25 дана на нови рок од 115 календарских дана. Радови су завршени 30. априла 2024. године, а реализована средства износе 34.837.047,58 динара.

КАНАЛИЗАЦИЈА

Извођење радова на изградњи црпне станице канализације са потисним цевоводом на углу улица Вељка Петровића и Илије Ђуричића у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке, дана 24. јануара 2024. године, донета је одлука о обустави поступка због премашеног износа процењене вредности. У 2024. години није било реализације планираних средстава по овој позицији.

Извођење радова на реконструкцији и доградњи ППОВ Ковиљ, са набавком и уградњом материјала

За наведену инвестициону активност није спроведен поступак јавне набавке јер још увек није окончан поступак уписа у катастар непокретности, те у 2024. години није исходовано решење којим се одобрава извођење радова.

Сходно наведеном у 2024. години није било реализације планираних средстава по овој позицији

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА - ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2024. године, реализована финансијска средства Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за инвестициона улагања по овом програму износе 34.837.047,58 динара.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Водовод

-Праћење и одржавање евиденције стања јавних чесми и бунара (Катастар)

У извештајном периоду није било реализације по овој позицији јер нису изграђени нови објекти (нема нових објеката за евидентирање).

-Одржавање јавних чесми

У оквиру ове позиције у току 2024. године реализована су 23 радна налога на отклањању кварова на јавним чесмама на територији Града Новог Сада, по пријавама грађана. Реализована су средства у износу од 133.270,00 динара.

-Одржавање, ревитализација и санација јавних копаних и бушених бунара и објеката

У извештајном периоду није било реализације по овој позицији.

-Ликвидација - санација објеката и бунара

У извештајном периоду није било реализације по овој позицији.

-Катастар надземних хидраната, оспособљавање постојећих, обележавање мреже нових хидраната

У извештајном периоду за потребе поправки и интервенција на хидрантима реализована су 54 радна налога. На овој позицији реализована су средства у износу од 711.815,00 динара што је знатно више од планираног износа.

-Интервентно снабдевање пијаћом водом

Интервентно снабдевање пијаћом водом се врши због прекида водоснабдевања, а као последица хаварија на систему, блокаде водоводне мреже, инвестиционих радова на систему и по налогу инспекцијских служби.

За интервентно снабдевање пијаћом водом цистернама, реализовано је 120 радних налога. Реализована је и помоћ цистернама са водом за спортске и културне манифестације. У извештајном периоду реализована су средства у износу од 2.735.084,00 динара, што је знатно више од планираног износа.

-Хаварије на секундарној мрежи водовода

Санације хаварија вршене су по пријавама грађана и налозима Градске управе за инспекцијске послове и Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

У 2024. години пријављено је 4.136 кварова и недостатака на водоводној мрежи. Као кварови и недостаци пријављивани су: цурење воде на хидранту, јавној површини и у водомерном шахту, кварови на вентилима и јавним чесмама, мутна вода, нестанак и слаб притисак воде, појава воде у подруму, и др.

Реализована средства у 2024. години износе 67.337.836,00 динара, што је знатно више од планираног износа.

-Интервентно одржавање водоводне мреже по налогу инспекцијских служби.

У извештајном периоду није било реализације по овој позицији.

Канализација

Одржавање атмосферске канализације је вршено редовно и подразумева планиране послове на прању канализационе мреже свих пречника, прању главних канализационих колекторских праваца, прању сливника и сливничких прикључака, замени оштећених рамова и поклопаца на шахтовима, замени оштећених рамова и сливничких решетки на сливницима, прању базена црпних станица канализације, пражњењу корпи и контејнера са механичким нечистоћама на црпним станицама и постројењима за пречишћавање отпадних вода, одржавању и редовном сервису хидромашинске опреме црпних станица канализације, одржавању и редовном сервису електро опреме црпних станица канализације као и праћењу рада црпних станица канализације путем даљинског надзора. Наведена позиција реализована у износу од 36.958.000,00 динара.

Интервентни радови

У извештајном периоду вршени су: санација или замена физички хаварисаних делова канализационе мреже, прикључака и шахтова, уклањање механичких препрека у канализационој мрежи, прикључцима и шахтовима, одгушења на мрежи, прикључцима и шахтовима, отклањање застоја у раду хидромашинске и електроопреме црпних станица канализације, отклањање застоја у раду опреме на постројењима за пречишћавање отпадних вода, интервенције услед већих падавина, као и рад интервентних дежурних служби. Реализована су средства у већем обиму од планираног и то у износу од 11.753.000,00 динара.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ - ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2024. године, Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад уместо планираних 96.000.000,00 динара за текуће одржавање водовода и канализације из сопствених средстава Предузећа реализовало је укупно 119.629.005,00 динара, односно 124,61% у односу на планирана средства.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ-табеларни приказ

Програмска позиција	Планирана средства за 2024. годину	Реализовано до 31.12.2024. године	Проценат 3/2 (%)
1	2	3	4
I ВОДОВОД	46.000.000,00	70.918.005,00	154,17%
Праћење и одржавање евиденције стања јавних чесми и бунара (Катастар)	100.000,00	-	-
Одржавање јавних чесми	1.500.000,00	133.270,00	8,88%
Одржавање, ревитализација и санација јавних копаних и бушених бунара и објеката	1.000.000,00	-	-
Ликвидација - санација објеката и бунара	400.000,00	-	-
Катастар надземних хидраната, оспособљавање постојећих, обележавање мреже нових хидраната	500.000,00	711.815,00	142,36%
Интервентно снабдевање пијаћом водом	2.000.000,00	2.735.084,00	136,75%
Хаварије на секундарној мрежи водовода	40.000.000,00	67.337.836,00	168,34%
Интервентно одржавање водоводне мреже по налогу инспекцијских служби	500.000,00	-	-
II КАНАЛИЗАЦИЈА	50.000.000,00	48.711.000,00	97,42%
Одржавање атмосферске канализације	40.000.000,00	36.958.000,00	92,40%
Интервентни радови	10.000.000,00	11.753.000,00	117,53%
УКУПНО:	96.000.000,00	119.629.005,00	124,61%





Број: 4.3-6710/2

Датум: 24. март 2025. године.

На основу члана 12. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Водовод и канализација" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 46/20) и члана 33. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад од 20.10.2016. и 01.06.2017.године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на 1. седници одржаној 24. марта 2025. године, доноси

ОДЛУКУ

I. Усваја се Извештај реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2024. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, за период 01. јануар – 31. децембар 2024. године, а који је саставни део ове одлуке.

II. Извештај из тачке I. ове одлуке, доставити Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Борис Јевтић

Доставити:

- Градској управи за комуналне послове
- Директору
- Техничком директору
- Сектору финансијских послова
- Сектору инвестиционо технички
- Сектору правних, кадровских и административних послова
- Архиви



ИЗВЕШТАЈ
о реализацији Програма инвестиционих улагања
Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и
текућег одржавања водовода и канализације за 2024. годину
који се не финансира из буџета Града Новог Сада,
за период 01. јануар - 31. децембар 2024. године

Програм инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2024. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, донет је у складу са чланом 12. став 1. тачка 22. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Комуналне радне организације "Водовод и канализација" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Програм инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2024. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/23).

Наведеним Програмом планирана су средства у износу од 157.500.000,00 динара, од чега се 61.500.000,00 динара односило на инвестициона улагања, а 96.000.000,00 динара на текуће одржавање водовода и канализације.

I ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	
ВОДОВОД	
Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 1 на изворишту Штранд у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације уговорених обавеза	35.000.000,00
КАНАЛИЗАЦИЈА	
Извођење радова на изградњи црпне станице канализације са потисним цевоводом на углу улица Вељка Петровића и Илије Ђуричића у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације обавеза	12.000.000,00
Извођење радова на реконструкцији и доградњи ППОВ Ковиљ, са набавком и уградњом материјала	14.500.000,00
УКУПНО:	61.500.000,00

Реализација инвестиција предвиђених наведеним Програмом, у извештајном периоду од 01. јануара до 31. децембра 2024. године:

Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 1 на изворишту Штранд у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације уговорених обавеза

У 2023. години, закључен је уговор дана 29.05.2023. године, са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 34.996.060,30 динара. Уговорени рок за извођење радова је 90 календарских дана. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 26.06.2023. године али због повећане потрошње воде и потребом за сировом водом из предметног бунара, наредног дана радови су обустављени. Наиме, просечна дневна потрошња воде била је висока како у летњем тако и у јесењем периоду и експлоатација предметног бунара била је кључна за уредно водоснабдевање Града. Радови на реконструкцији опреме настављени су дана 29.01.2024. године. Из наведених разлога, извођач није могао реализовати радове планираном динамиком, те се указала потреба за продужењем рока извођења радова.

У извештајном периоду, Предузеће је закључило Анекс Уговора бр. 5.2-12619 од 29.05.2023. године и то:

- Анекс број 1 (дел.бр 5.2 - 7746 од 02.04.2024. године) - за измену уговореног рока извођења радова у смислу продужења истог за 25 дана, те је извођач дужан да све уговорене обавезе изведе у року од 115 календарских дана.

Завршени су сви уговорени радови дана 30.04.2024. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност свих изведених радова износи 34.837.047,58 динара.

Након изведених радова на санацији бунара БХД 1 на изворишту "Штранд", утискивањем нових дренажа, било је неопходно извршити замену дотрајале опреме на овом бунару. Реализацијом предметне инвестиције, стекли су се услови за даљу несметану експлоатацију предметног бунара.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 35.000.000,00 динара која су реализована.

У извештајном периоду, извођач радова испоставио је једну привремену и окончану ситуацију од 27.05.2024. године. Реализована су средства у укупном износу од 34.837.047,58 динара.

Извођење радова на изградњи црпне станице канализације са потисним цевоводом на углу улица Вељка Петровића и Илије Ђуричића у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације обавеза

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке, донета је одлука о обустави поступка дана 24.01.2024. године, због премашеног износа процењене вредности.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 12.000.000,00 динара која нису реализована.

Извођење радова на реконструкцији и доградњи ППОВ Ковиљ, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, Предузеће је поднело захтев за исходовање решења којим се одобравају предметни радови. Градска управа за урбанизам и грађевинске послове одбацила је захтев уз образложење да још увек није окончан поступак уписа овог објекта у катастар непокретности. Како у извештајном периоду није исходовано решење о одобрењу за извођење радова, поступак јавне набавке није спроведен у 2024. години.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 14.500.000,00 динара која нису реализована.

II ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Радови на одржавању водоводне и канализационе мреже који се финансирају сопственим средствима Предузећа, планирани су у укупном износу од 96.000.000,00 динара, где се наведена средства односе на радове из групе радова I - водовод у износу од 46.000.000,00 динара и на радове из групе радова II - канализација у износу од 50.000.000,00 динара.

У односу на планиране позиције текућег одржавања водовода и канализације за 2024. годину, утрошена сопствена средства Предузећа исказана у процентима у односу на планирана средства, у извештајном периоду, износе 124,61%, где се наведена средства односе на радове из групе радова I - водовод у износу од 70.918.005,00 динара односно 154,17% и на радове из групе радова II - канализација у износу од 48.711.000,00 динара односно 97,42%, што се види из табеларног приказа реализације текућег одржавања водовода и канализације за 2024. годину.

Наведене програмске позиције обухватају следеће послове:

ВОДОВОД

Праћење и одржавање евиденције стања јавних чесми и бунара (Катастар), неопходно је због газдовања и управљања подземним водама, односно евидентирања ко и колико има водозахватних објеката, колико и који квалитет подземних вода се захвата и у које сврхе. Дакле, неопходан је због рационализације и правилног коришћења расположивих резерви подземних вода. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 100.000,00 динара. У извештајном периоду нису изграђени нови објекти (нема објеката за евидентирање), те средства нису реализована.

Одржавање јавних чесми подразумева одржавање водоводних и канализационих инсталација у исправном стању за јавне чесме на јавној површини које су евидентирани у катастру јавних чесми и снабдевају се са система Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара. У извештајном периоду реализација средстава је 133.270,00 динара, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 8,88%.

Одржавање, ревитализација и санација јавних копаних и бушених бунара и објеката ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад. Сектор "Водовод" врши редован обилазак јавних копаних бунара и чесми на годишњем нивоу, а ванредно обилази и проверава већ постављена обавештења и обележја на основу обавештења Градске управе за комуналне послове и обавештења Сектора за санитарни надзор и јавно здравље Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију и извештаја Института за јавно здравље Војводине о исправности воде за пиће на поменутим објектима. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било потребе за ангажовањем средстава, те средства нису реализована.

Ликвидација - санација објеката и бунара врши се ради заштите водоносних слојева од могућег загађења (случајног или намерног), пошто представљају директни контакт са подземним водама, као и да би се спречила неконтролисана експлоатација. Ликвидацију-санацију неопходно је извршити стручно са дезинфекцијом и обележавањем терена, због могућих накнадних радова (изградње нових објеката). На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 400.000,00 динара. У извештајном периоду, није било потребе за ликвидацијом, односно санацијом бунара, те средства нису реализована.

Катастар надземних хидраната, оспособљавање постојећих, обележавање мреже нових хидраната. Служба ГИС у својим базама чува податке о броју, типу, стању и локацији свих евидентираних хидраната на својој мрежи. Из овог електронског катастра се преко графичког интерфејса или упита у базу може врло ефикасно пронаћи један или више хидраната по одређеном критеријуму. Подаци се ажурирају у складу са радом службе "Одржавање водоводне мреже" која доноси податке са терена. Значај исправности информација о овим елементима нарочито се огледа у раду Ватрогасно-спасилачке бригаде Нови Сад, којој хидранти служе за пуњење цистерни у току интервенција. Служба "Одржавање водоводне мреже" изводи радове на оспособљавању постојећих хидраната. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 500.000,00 динара; У извештајном периоду реализација средстава је 711.815,00 динара, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 142,36%.

Интервентно снабдевање пијаћом водом врши се због прекида водоснабдевања а као последица хаварија на систему, блокаде водоводне мреже, инвестиционих радова на систему и по налогу инспекције. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу 2.000.000,00 динара. У извештајном периоду реализација средстава је 2.735.084,00 динара, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 136,75%.

Хаварије на секундарној мрежи водовода - односно санација дотрајале мреже када то захтева хитну интервенцију услед пуцања инсталација на кућним прикључцима и секундарној мрежи и поправка са циљем да се побољша функционисање мреже, спречи угроженост грађана, елиминишу губици на систему као и осигура безбедност одвијања саобраћаја. Врши се и по пријавама грађана и налозима Градске управе за инспекцијске послове и Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 40.000.000,00 динара. У извештајном периоду реализација средстава је 67.337.836,00 динара, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 168,34%.

Интервентно одржавање водоводне мреже по налогу инспекцијских служби - служба "Одржавање водоводне мреже", услед поремећаја снабдевања пијаћом водом а на захтев корисника услуга, врши послове на санацији водоводне мреже као и по налогу Градске управе за инспекцијске послове. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 500.000,00 динара. У извештајном периоду није било налога инспекцијских служби за интервентно одржавање водоводне мреже, те средства нису реализована.

КАНАЛИЗАЦИЈА

Одржавање атмосферске канализације се врши редовно и подразумева планиране послове на прању канализационе мреже свих пречника, прању главних канализационих колекторских праваца, прању сливника и сливничких прикључака, замени оштећених рамова и поклопаца на шахтовима, замени оштећених рамова и сливничких решетки на сливницима, прању базена црпних станица канализације, пражњењу корпи и контејнера са механичким нечистоћама на црпним станицама и постројењима за пречишћавање отпадних вода, одржавању и редовном сервису хидромашинске опреме црпних станица канализације, одржавању и редовном сервису електро опреме црпних станица канализације. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 40.000.000,00 динара. У извештајном периоду реализација средстава је 36.958.000,00 динара, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 92,40%.

Интервентни радови подразумевају: санацију или замену физички хаварисаних делова канализационе мреже, прикључака и шахтова; замену оштећених рамова и поклопаца на шахтовима, замену оштећених рамова и сливничких решетака на сливницима; уклањање механичких препрека у канализационој мрежи, прикључцима и шахтовима; одгушења на мрежи, прикључцима и шахтовима; отклањање застоја у раду хидромашинске и електроопреме црпних станица канализације; отклањање застоја у раду опреме на постројењима за пречишћавање отпадних вода; интервенције услед већих падавина као и рад интервентних дежурних служби. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 10.000.000,00 динара. У извештајном периоду реализација средстава је 11.753.000,00 динара, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 117,53%.

Табеларни приказ реализације текућег одржавања водовода и канализације за 2024. годину

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ - ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	Планирана средства за 2024. годину	Реализовано до 31.12.2024. године	% реализације
	1	2	2:1
I ВОДОВОД	46.000.000,00	70.918.005,00	154,17%
Праћење и одржавање евиденције стања јавних чесми и бунара (Катастар)	100.000,00	0,00	0,00%
Одржавање јавних чесми	1.500.000,00	133.270,00	8,88%
Одржавање, ревитализација и санација јавних копаних и бушених бунара и објеката	1.000.000,00	0,00	0,00%
Ликвидација - санација објеката и бунара	400.000,00	0,00	0,00%
Катастар надземних хидраната, оспособљавање постојећих, обележавање мреже нових хидраната	500.000,00	711.815,00	142,36%
Интервентно снабдевање пијаћом водом	2.000.000,00	2.735.084,00	136,75%
Хаварије на секундарној мрежи водовода	40.000.000,00	67.337.836,00	168,34%
Интервентно одржавање водоводне мреже по налогу инспекцијских служби	500.000,00	0,00	0,00%
II КАНАЛИЗАЦИЈА	50.000.000,00	48.711.000,00	97,42%
Одржавање атмосферске канализације	40.000.000,00	36.958.000,00	92,40%
Интервентни радови	10.000.000,00	11.753.000,00	117,53%
УКУПНО ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ:	96.000.000,00	119.629.005,00	124,61%

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА за 2024. годину - опис послова

Одржавање јавних чесми

Служба одржавања водоводне мреже реализовала је 23 радна налога за отклањање кварова на јавним чесмама у 2024. години, по пријавама грађана. Укупна вредност извршених радова је 133.270,00 динара.

Катастар надземних хидраната, оспособљавање постојећих, обележавање мреже нових хидраната

За потребе поправки и интервенција на хидрантима реализовано је 54 радних налога. Укупна вредност извршених радова је 711.815,00 динара.

Интервентно снабдевање пијаћом водом

За интервентно снабдевање пијаћом водом цистернама реализовано је 120 радних налога, због прекида водоснабдевања као последица извођења планираних инвестиционих радова. Реализована је и помоћ цистернама са водом за спортске и културне манифестације. Вредност извршених радова износила је 2.735.084,00 динара.

Хаварије на секундарној мрежи водовода

У 2024. години пријављено је 4.136 кварова и недостатака на водоводној мрежи, од тога:

[Б] ЦУРЕЊЕ НА ХИДРАНТУ - реализовано је 54 радна налога
[Ц] ЦУРЕЊЕ НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ - реализовано је 1.363 радна налога
[Д] ЦУРЕЊЕ У ВОДОМЕРНОМ ШАХТУ - реализовано је 1.530 радних налога
[Е] КВАР НА 1. ВЕНТИЛУ ВОДОМЕРНОГ СЕТА - реализовано је 84 радна налога
[Ф] КВАР НА 2. ВЕНТИЛУ ВОДОМЕРНОГ СЕТА - реализовано је 163 радна налога
[Г] КВАР НА ЈАВНОЈ ЧЕСМИ - реализовано је 23 радна налога
[И] МУТНА ВОДА - реализовано је 127 радних налога
[К] НЕМА ВОДЕ - реализовано је 294 радна налога
[Н] СЛАБ ПРИТИСАК ВОДЕ - реализовано је 210 радних налога
[О] ВОДА У ОБЈЕКТУ - ПОДРУМУ - реализовано је 33 радна налога
[ОСТ] ОСТАЛО - реализовано је 202 радна налога
[П] УГРОЖЕНА БЕЗБЕДНОСТ ИЛИ ЗДРАВЉЕ ЉУДИ - реализовано је 12 радних налога
[W] ИСПИРАЊЕ - реализован је 41 радни налог

Највећи број налога за отклањање хаварије на водоводној мрежи, реализован је за Улицу Јурија Гагарина у Сремској Каменици (укупно 56).

Највећи број пријава пристигао је у августу (442 пријаве).

Најмањи број пријава пристигао је у јануару (216 пријава).

Хаварија на водоводној мрежи, за коју је утрошено највише средстава:

- за радове на санацији хаварије, у ул. Војводе Путника 89 у Сремској Каменици утрошено је 7.967.404,00 динара.


Број хаварија (цурење на јавној површини) по улицама:

УЛИЦА	НАСЕЉЕНО МЕСТО	ХАВАРИЈЕ НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ
Јурија Гагарина	Сремска Каменица	54
Сремских партизана	Сремска Каменица	23
Прерадовићева	Петроварадин	18
Иве Лоле Рибара	Сремска Каменица	14
Булевар ослобођења	Нови Сад	13
Липарје	Нови Лединци	13
Митрополита Стратимировића	Сремски Карловци	13

Табеларни приказ пријава на водоводој мрежи у 2024.години

РЕОНИСКИ	[B] CURENJE NA HIDRANTU	[C] CURENJE NA JAVNOJ POVRŠINI	[D] CURENJE U VODOMERNOM ŠAHTU	[E] KVAR NA 1. VENTILU VODOMERNOG SETA	[F] KVAR NA 2. VENTILU VODOMERNOG SETA	[G] KVAR NA JAVNOJ CESMI	[I] MUTNA VODA	[K] NEMA VODE	[N] SLAB PRITISAK VODE	[O] VODA U OBJEKTU- PODRUMU	[OST] Ostalo	[P] UGROŽENA BEZBEDNOST ILI ZDRAVLJE LJUDI	[W] ISPIRANJE
ЈАН.	3	51	93	8	5		12	15	13	2	14		
ФЕБ.	4	94	125	7	3	2	22	15	10	4	15	2	
МАР.	2	92	149	9	9	3	31	13	12	2	17		1
АПР.	1	115	147	6	24	2	8	28	23	1	16		5
МАЈ.	2	144	117	5	14	3	8	14	14	4	9	2	
ЈУН.	6	122	109	7	15	6	4	43	15	3	14		
ЈУЛ.	9	153	123	3	16	1	10	37	28	3	13	2	2
АВГ.	7	164	126	5	18	3	7	58	12	2	15		25
СЕП.	4	150	146	6	18	1	4	10	30	2	16		1
ОКТ.	3	140	119	11	15	2	5	20	13	1	33		
НОВ.	8	73	134	9	16		6	15	17	5	26	4	2
ДЕЦ.	5	65	142	8	10		10	26	23	4	14	2	5
2024	54	1363	1530	84	163	23	127	294	210	33	202	12	41

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ за 2024. годину – опис послова

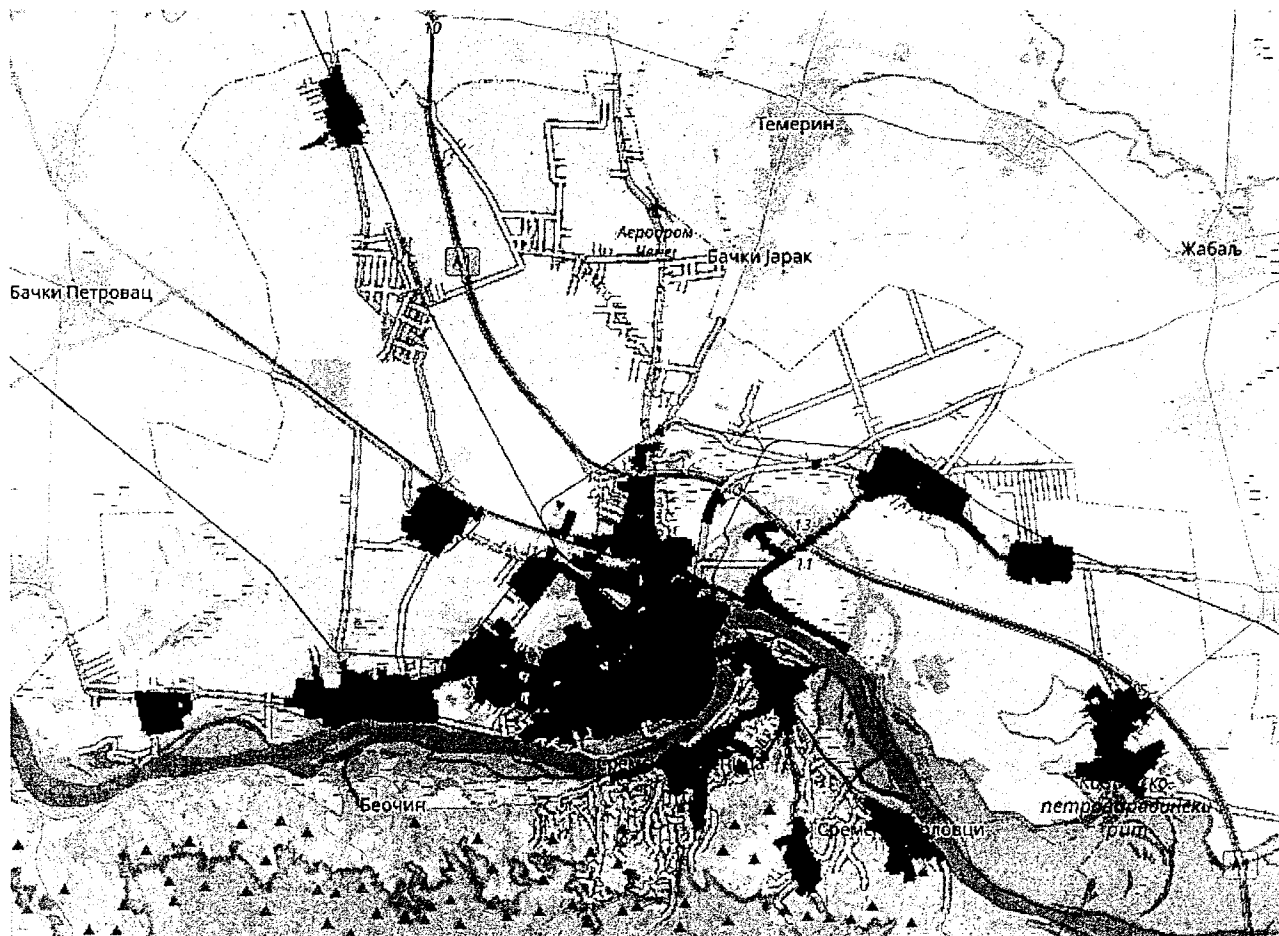

Постојећа канализациона мрежа

Послови на текућем одржавању канализације се обављају на територији Града Новог Сада и приградских насеља.

Предмет одржавања је:

- 1.200 km канализационе мреже од минималног пречника прикључка Ø160 до колекторских праваца димензија 4m x 2,5m
- 103 црпних станица канализације
- 3 постројења за пречишћавање отпадних вода.

Прање канализационе мреже свих пречника

За прање канализационе мреже потребна су истовремено два специјална возила WOMA (возило за прање под притиском) и Сливничар (вакуумско возило које усисава испран садржај). Посаду сваког од тих возила чине возач и два радника. У 2024. години опрано је 8,5 km канализационе мреже различитих пречника за 340 сата проведених на терену. Дневно на овом послу распоређено је највише 4 возила.

За подручја без канализационе мреже врши се пражњење септичких јама корисника. За овај посао се користи специјално возило Сливничар, са посадом коју чине возач и два радника. У 2024. години испражњено је 1829 септичких јама. Дневно на овом послу распоређено је највише 5 возила.

Праће главних канализационих колекторских праваца

За праће главних канализационих колекторских праваца потребна су два специјална возила WOMA и Сливничар. Посаду сваког возила чине возач и два радника. У 2024. години опрано је 0,4 km главних канализационих праваца за 16 сати проведених на терену.

Праће сливника и сливничких прикључака


За праће сливника и сливничких прикључака потребно је специјално возило Canal Jet (возило двоструке намене за испирање канализације воденим млазом под високим притиском и за усисавање муљевитог садржаја). Посаду овог возила чине возач и два радника. У 2024. години опрано је 3.491 сливник и сливничких прикључака за 872 сати проведених на терену. Дневно на овом послу распоређено је највише 3 возила.

Замена оштећених рамова и поклопаца на шахтовима, замена оштећених рамова и сливничких решетки на сливницима

Сектор канализације располаже са грађевинском оперативом за три независне екипе које раде на терену и састоји се од:

	МЕХАНИЗАЦИЈА
	ПУТАРИ
1	VW-TRANSPORTER
2	IVEKO
3	IVEKO са руком
	КИПЕРИ
1	IVEKO КИПЕР – 2 КОМАДА
	СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА
1	JETA
2	MIKSER - CARMIX
	КОМБИНОВАНЕ МАШИНЕ
1	BAGER JCB 3X – 2 КОМАДА

Табела изведених радова 2024. године је приложена на крају извештаја.

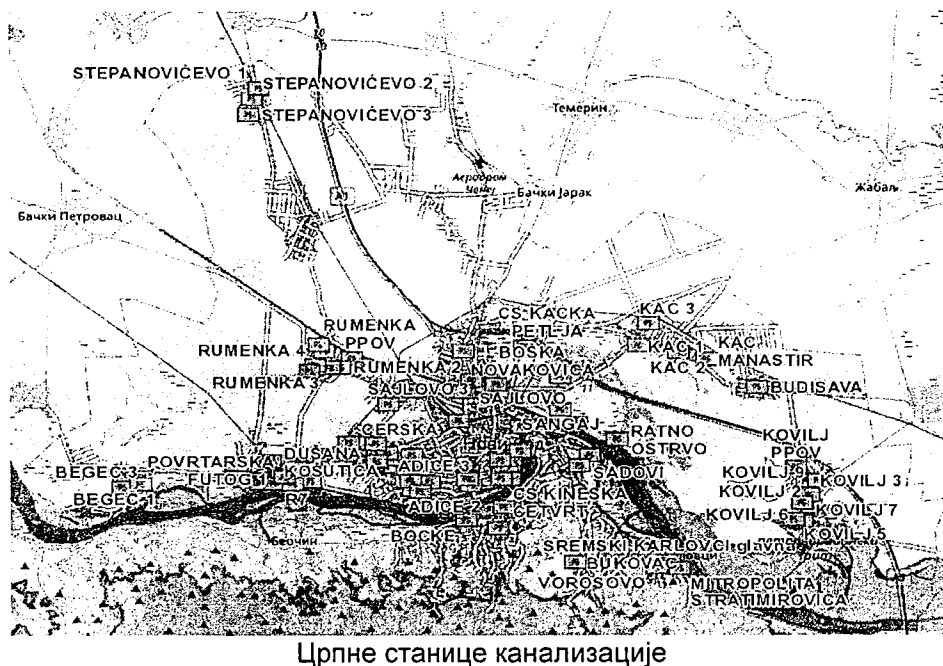

Прање базена црпних станица канализације

За прање базена црпних станица канализације потребна су два специјална возила WOMA и Сливничар. Посаду сваког возила чине возач и два радника. У 2024. години базени црпних станица канализације су опрани 17 пута за 68 сати проведена на терену.

Пражњење корпи и контејнера са механичким начистоћама на црпним станицама канализације и постројењима за пречишћавање отпадних вода

У 2024. години испражњено је 1.425 корпи на црпним станицама канализације и 82 контејнера на црпним станицама и постројењима за пречишћавање. Утрошено је 1.718 сати рада на овај посао. Посаду специјалног возила за пражњење чине један возач и два радника.

Одржавање и редован сервис хидромашинске опреме црпних станица канализације

На 103 црпне станице канализације у непрекидном аутоматском раду је 241 канализациона пумпа распона снаге од 2 киловата до 132 киловата, 30 аутоматских чистача решетки и аутоматских сита за спречавање загушења пумпи. У 2024. години је 88 радних дана утрошено на овај посао. Извршавају га 3 радника која користе камион Застава Турбо Ривал.

Одржавање и редован сервис електро опреме црпних станица канализације

У 2024. години је извршено 2.875 обиласка (због превентивног и текућег одржавања) свих црпних станица канализације. На овом послу су ангажоване 2 екипе радника. Једну екипу чине 2 радника и возило VW CITY VAN.

Праћење рада црпних станица канализације путем даљинског надзора

Рад свих црпних станица канализације и постројења за пречишћавање отпадних вода се прати путем даљинског надзора. Ван радног времена дежурне службе електричара сектора канализације и оператера на постројењима за пречишћавање реагују на алармна стања даљинског надзора. Анализу података даљинског надзора, као превентивног извора информација о систему, у радно време врше 2 радника.

Санација или замена физички хаварисаних делова канализационе мреже, прикључака и шахтова

Сектор канализације радове ове врсте изводи са горе поменутом грађевинском оперативом и радном снагом. За потребе извођења радова већег обима ангажује по уговору треће лице. Табела изведених радова 2024. године је приложена на крају извештаја.

Уклањање механичких препрека у канализационој мрежи, прикључцима и шахтовима; одгушења на мрежи, прикључцима и шахтовима

Одгушења на мрежи

Одгушења на канализационој мрежи спадају у групу интервентних радова. Пријаве загушења примају се позивом на кориснички сервис ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад или директно телефонским позивом служби Функционално одржавање канализационе мреже. По примљеној пријави загушења дежурна екипа, коју чини специјално возило WOMA са припадајућом посадом (возач и два радника), излази на терен и врши одгушење на мрежи. У 2024. години мрежа је одгушена 133 пута за 156 сати проведених на терену. Дневно на овом послу распоређено је највише 2 возила. Рад је организован у две смене радним данима и једној смени викендом и празницима.

Одгушења на прикључцима

Одгушења на канализационим прикључцима спадају у групу интервентних радова. Пријаве загушења примају се позивом на кориснички сервис ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад или директно телефонским позивом служби Функционално одржавање канализационе мреже. По примљеној пријави загушења дежурна екипа, коју чини специјално возило WOMA са припадајућом посадом (возач и два радника), излази на терен и врши одгушење на прикључку. У 2024. години одгушено је 270 прикључка за 305 сати проведених на терену. Дневно на овом послу распоређено је највише 2 возила. Рад је организован у две смене радним данима и једној смени викендом и празницима.

Одгушења на шахтовима

Одгушења на канализационим шахтовима спадају у групу интервентних радова. Пријаве загушења примају се позивом на кориснички сервис ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад или директно телефонским позивом служби Функционално одржавање канализационе мреже. По примљеној пријави загушења дежурна екипа, коју чини специјално возило WOMA са припадајућом посадом (возач и два радника), излази на терен и врши одгушење шахта. У 2024. години одгушено је 20 шахтова за 15 сати проведена на терену. Дневно на овом послу распоређено је највише 2 возила. Рад је организован у две смене радним данима и једној смени викендом и празницима.

Отклањање застоја у раду хидромашинске и електроопреме црпних станица канализације

Застоји у раду опреме у 2024. години били су отклањани, без одласка на терен путем даљинског надзора, просечно сат времена дневно радом једног оператера контролно командног центра. Изласцима на терен, у радно време и ван радног времена, извршене су 950 електро и 952 машинске интервенције. Електро интервенције обавља дежурна електро екипа (2 радника и возило VW CITY VAN), а машинске интервенције 3 радника возилом типа Турбо Ривал.

Отклањање застоја у раду опреме на постројењима за пречишћавање отпадних вода

У 2024. години оператери на постројењима су 120 пута интервенисали на алармна стања даљинског надзора и отклонили квар. За 22 аларма сложенијих кварова радове је изводио сервисер опреме по уговору за трећа лица.

Интервенције услед већих падавина

Количина атмосферских падавина која треба да се одведе са јавних површина у системе канализације везана је за интензитет падавина. Служба Функционално одржавање канализационе мреже ради у две смене, укључујући викенде и празнике. У зависности од врсте проблема на интервенцију се упућују специјална возила Woma, Сливничар или Canal Jet, са припадајућом посадом која подразумева возача и два радника. У 2024. години је било 9 дана са кишом већег интензитета.

Рад интервентних дежурних служби

Сектор Канализација је у току 2024. године поседовао следеће дежурне службе:

- Четири дежурне електро екипе које се смењују по распореду 12/24/12/48, а у саставу једне екипе је 2 радника и возило VW CITY VAN.
- Две дежурне екипе за одгушење канализационе мреже које раде радним данима у две смене по 8 сати, а викендом и празницима у преподневној смени 8 сати. Екипу чини возач, два радника и специјално возило за одгушење WOMA.

Табела изведених радова у 2024. години сектора канализација:

Нови Сад	Шумадијска 1	ХНП
Нови Сад	Шекспирова 46	РИП (лаки)
Нови Сад	Шекспирова (код Макијата)	РИП
Нови Сад	Шајкашка 9	ХНП
Нови Сад	Шајкашка 4	РИП
Нови Сад	Шајкашка 26	РИП
Будисава	Шајкашка 10	ХНШ
Будисава	Шајкашка 10	ХНШ
Нови Сад	Шајкашка	РИП
Нови Сад	Шајкашка	ХНШ
Нови Сад	Шајкашка	ХНП
Петроварадин	Чајковског 10А	РИП
Футог	ЦС 2	БП
Футог	ЦС 2	РИП x 2ком
Нови Сад	Цара Душана 62	ХНП
Нови Сад	Хероја Пинкија 14	ХНП
Нови Сад	Хајдук Вељкова 11	ХНП
Нови Сад	Футошки пут 44Б	РИП
Нови Сад	Футошки пут 38	БП
Нови Сад	Футошки пут 36	РИП
Нови Сад	Футошки пут 34	РИП (лаки)
Нови Сад	Футошки пут 34	ХНМ
Нови Сад	Футошки пут 32Ц	БП
Нови Сад	Футошка 20	НСР
Петроварадин	Фрушкогорског одреда 12	РИП
Нови Сад	Фрушкогорска 36	ХНП
Нови Сад	Филипа Филиповића 24	БП
Нови Сад	Ужичка 2А	ХНП
Нови Сад	Угао Хиландарске и Словачке	НСШ
Нови Сад	Угао Хаџи Рувимове и Илије Бирчанина	РИП
Нови Сад	Угао Хаџи Рувимове и Илије Бирчанина	РИП (тешки)
Нови Сад	Угао Стражиловске и Максима Горког	ХВС
Футог	Угао Соње Маринковић и Царице Милице	РИП
Нови Сад	Угао Словачке и Достојевског	ХНМ
Нови Сад	Угао Сентелеки Корнела и Петефи Шандора	РИП
Петроварадин	Угао Прерадовићеве и Рачког	РИП
Нови Сад	Угао Мичуринове и Богдана Гарабантина	ХНТС
Сремска Каменица	Угао Милоша Обилића и Карађорђево	РИП (тешки)
Нови Сад	Угао Миленка Грчића 8А и Банатске	РИП
Нови Сад	Угао Мајке Југовића и Алексе Ненадовића	РИП
Ветерник	Угао Михајла Пупина и Далматинске	ХНП
Нови Сад	Угао Лазе Нанчића и Булевар Европе	РИП
Ветерник	Угао краља Петра I и Милана Тепића	РИП
Нови Сад	Угао Корнелија Станковића и Руменачке	НСШ
Нови Сад	Угао Кисачке и Бранка Радичевића	НСШ

Нови Сад	Беле њиве 41	ХНП
Нови Сад	Угао Житни трг и Достојевског	РИП
Нови Сад	Угао Јована Ђорђевића и Булевара Михајла Пупина	НСШ
Ветерник	Угао Јелене Кон и Дунавске	НРИП
Нови Сад	Угао Индустијске и Душана Кошутића	ХНМ
Нови Сад	Угао Житног трга и Достојевског	НРИП
Нови Сад	Гундулићева 4	ХНМ
Ветерник	Цара Лазара 142	НРИП
Нови Сад	Угао Достојевског и Житног трга	РИП
Нови Сад	Угао Булевар цара Лазара и Подгоричке	РИП (тешки)
Нови Сад	Угао Булевар ослобођења и Ћирпанове	ХНТС
Нови Сад	Угао Булевар ослобођења и Јеврејске	НСШ
Нови Сад	Угао Булевар Михајла Пупина и Јована Ђорђевића	ХНМ
Нови Сад	Угао Булевар краља Петра I и Руменачке	РИП
Нови Сад	Угао Булевар краља Петра I и Краљевића Марка	НРИП
Нови Сад	Угао Булевар Јована Дучића и Булевар кнеза Милоша	РИП
Нови Сад	Угао Булевар Јована Дучића и Булевар кнеза Милоша	НСШ
Нови Сад	Угао Бранка Ћопића и Бањалучке	НСШ
Нови Сад	Угао Бате Бркића и Сељачких буна	НСШ
Нови Сад	Угао Балзакове и Булевар цара Лазара	РИП
Нови Сад	Угао Бранимира Ћосића и Мајевичке	ХНП - блиндирање
Нови Сад	Ћирила и Методија 144	ХНП
Нови Сад	Радничка 28	СШ
Нови Сад	Руменачка 44	РИП
Петроварадин	Тунислава Пауновића 25	ХНШ
Нови Сад	Трг младенаца 5	РИП
Нови Сад	Трг Марије Трандафил 13	ХНП

Сремска Каменица	Трг Змај Јове 3 - 3А	ХНП
Сремска Каменица	Томислава Матасића 3	ВПС
Петроварадин	Толстојева 14 Тодора	ХНМ
Нови Сад	Тодора Тозе Јовановића 14	НРИП
Нови Сад	Темеринска 87	РИП
Нови Сад	Темеринска 53	НСШ
Нови Сад	Темеринска 19 (пијаца)	ХНВС
Нови Сад	Телепска ББ	НРИП
Нови Сад	Текелијина 14	ХНС и ХНП
Нови Сад	Таковска 9	ХНМ
Нови Сад	Стратимировићева 8	ХНП
Нови Сад	Стражиловска 7	ХНП
Нови Сад	Стојана Јанковића 18	ХНШ
Нови Сад	Стјепана Митрова Љубише 12	БП
Нови Сад	Стјепана Митрова Љубише 10	ХНШ
Нови Сад	Стевана Чаленића 2	БП
Нови Сад	Стевана Момчиловића 8	БП
Нови Сад	Стевана Момчиловића 10	БП
Нови Сад	Стевана Милованова 6	РИП
Нови Сад	Стевана Милованова 1А	БП
Нови Сад	Стевана Дороњског 8	РИП
Нови Сад	Стевана Брановачког 7	ХНМ
Нови Сад	Стевана Брановачког 12	РИП
Нови Сад	Стевана Брановачког 1	ХНМ
Нови Сад	Станоја Главаша 110	НРИП
Ветерник	Соње Маринковић 8	ХНП
Сремска Каменица	Војводе Мишића 19	ХНП
Нови Сад	Словачка 28	ХНШ
Футог	Славка Родића 9	ВПС (бетонирање прикључка
Нови Сад	Симе Матавуља код бр. 50	РИП (лаки)
Нови Сад	Симе Матавуља 16	РИП
Нови Сад	Сентандрејски пут 155	БП
Нови Сад	Сентандрејски пут 151	БП
Нови Сад	Сентандрејски пут 110	ХНП

Нови Сад	Сентандрејски пут 110	ХНМ
Нови Сад	Светозара Ћоровића 1	ХНМ
Ветерник	Светозара Милетића 15	ВПС
Ветерник	Светозара Милетића 15	Бетонирање колског улаза
Нови Сад	Сарајевска 7	ХНП
Нови Сад	Саве Ћисалова 25	ХНП
Нови Сад	Саве Ћисалова 16	ХНП
Нови Сад	Руменачки пут преко пута броја 6	РИП
Нови Сад	Руменачки пут 57	НРИП
Нови Сад	Руменачки пут 26	НСР
Нови Сад	Руменачки пут 23	РИП
Нови Сад	Руменачки пут 1	РИП
Нови Сад	Руменачки пут (код гробља)	РИП (2 ком)
Нови Сад	Руменачка иза броја 98	РИП
Нови Сад	Руменачка 98	БП
Нови Сад	Руменачка 25	СШ
Нови Сад	Руменачка 163	РИП
Нови Сад	Руменачка 161	РИП
Нови Сад	Руменачка 102 (Дом здравља)	БП
Нови Сад	Родољуба Чолаковића 10	ХНП
Петроварадин	Рачког 2	ХНП
Нови Сад	Раковачка 14	РИП
Нови Сад	Раде Смиљанова 15	ХНП
Нови Сад	Раде Кончара 1Б Раде	ХНМ
Футог	Раде Кондића 81 (код гробља)	ВПС (набијање)
Футог	Раде Кондића 71 (69)	РИП
Футог	Раде Кондића 171	РИП (лаки)
Футог	Раде Кондића	РИП (лаки)
Футог	Пут шајкашког одреда 4	РИП
Нови Сад	Пут шајкашког одреда 1 (Каћки мост)	СШ
Нови Сад	Пут шајкашког одреда 1 Пут	СШ
Нови Сад	Новосадског партизанског одреда	РИП
Нови Сад	Приморска 84А	СШ
Петроварадин	Прерадовићева 89	СШ

Петроварадин	Прерадовићева 89	НСШ
Петроварадин	Прерадовићева 80	РИП
Петроварадин	Прерадовићева 55-102	РИП
Петроварадин	Прерадовићева 49	РИП
Петроварадин	Прерадовићева 49	РИП
Петроварадин	Прерадовићева 34А, 36, 46	РИП
Петроварадин	Прерадовићева 123	РИП
Петроварадин	Прерадовићева 121	РИП
Ветерник	Петра Кочића 19	РИП
Нови Сад	Петра Дрезгића 9	БП
Нови Сад	Петефи Шандора 108	ХНП
Нови Сад	Патријарха Чарнојевића 2	ХНС
Нови Сад	Патријарха Чарнојевића	НРИП
Нови Сад	Пастерова 24	СШ
Нови Сад	Партизанских база 1	ХНТС и НСШ
Нови Сад	Партизанских база 1	РИП
Каћ	Партизанска 71	СШ
Футог	Партизанска 16	РИП
Нови Сад	Париске комуне 8	РИП
Нови Сад	Пап Павла 28	РИП
Нови Сад	Пап Павла 27	РИП
Нови Сад	Пап Павла 27	НРИП
Нови Сад	Паје Марковића Адамова 7	НРИП
Нови Сад	Павла Симића 9	СШ
Петроварадин	Павла Јуришића Штурма 25	ХНШ
Футог	ОШ "Десанка Максимовић"	БП x 2
Нови Сад	Отокара Кершованија 25	ХНП
Нови Сад	Омладинских радних акција 50	РИП
Нови Сад	Облачића Рада 17	РИП
Нови Сад	Новосадског сајма 6	ХНП
Ветерник	Новосадски пут 81	РИП
Нови Сад	Новосадски пут 119А Нова	РИП
Нови Сад	Николе Пашића 24	ХНШ
Нови Сад	Николе Пашића 22	ВПС (враћање бехатона)
Нови Сад	Николе Пашића 18-20	ХНП

Нови Сад	Николе Пашића 15	ХНМ
Нови Сад	Натошевићева 2	ХНП
Нови Сад	Народног фронта 67	ХНШ, ХНМ
Каћ	Моше Пијаде 85	ХНП
Нови Сад	Момчила Тапавице 6	РИП (лаки)
Петроварадин	Мишелук	РИП
Нови Сад	Мише Димитријевића 1А	ХНП
Нови Сад	Антића 20	ХНП
Ветерник	Милутина Миће Татића	
Нови Сад	Милутина Бојића 7	РИП
Нови Сад	Милоја Чиплића 4	БП
Нови Сад	Милоја Чиплића 2-4	РИП + БП
Нови Сад	Милете Јакшића 5	ХНМ
Нови Сад	Миленка Павловића 7	ХНШ
Нови Сад	Миленка Грчића 8	РИП
Нови Сад	Миленка Грчића 8	РИП
Нови Сад	Милеве Марић 14 - 16	ХНШ
Нови Сад	Милана Кома 2	РИП
Нови Сад	Масарикова 21	ХНП
Сремска Каменица	Марка Орешковића 4	РИП
Нови Сад	Максима Горког 6Б	РИП
Нови Сад	Максима Горког 4Д - 4Е	РИП
Нови Сад	Максима Горког 48Б и 48Ц	РИП и НРИП
Нови Сад	Максима Горког 48	ВПС
Нови Сад	Јоже Влаховића 5	ХНШ, РИП
Нови Сад	Јована Цвијића 15	РИП
Нови Сад	Јована Цвијића 13	ХНМ
Нови Сад	Јована Храниловића 41	ХНВС
Нови Сад	Јована Поповића 2	РИП
Нови Сад	Јована Микића Спартака 10	РИП
Нови Сад	Јована Ђорђевића 1	НСШ
Нови Сад	Јиречекова 5Ц	НРИП
Нови Сад	Јована Ђорђевића (код Бановинског пролаза)	НСР
Нови Сад	Авијатичарска 45	СШ
Нови Сад	Јернеја Копитара 45	РИП
Нови Сад	Јерменска 16	ХНП
Нови Сад	Јеврејска 33	СШ
Нови Сад	Јеврејска 20	НСР

Нови Сад	Јеврејска 1	НСР х 2ком
Нови Сад	Јанка Чмелика 21	БП
Нови Сад	Јана Хуса 13	РИП
Нови Сад	Илије Нешина 1	БП
Ветерник	Иве Лоле Рибара 40	БП
Нови Сад	Иве Андрића 1	БП
Нови Сад	Змајевачки пут 72	РИП (лаки)
Нови Сад	Змајевачки пут 37	РИП
Нови Сад	Змај Огњена Вука 8	ХНП
Нови Сад	Змај Огњена Вука 24	БП
Нови Сад	Змај Јовина 24	ХНМ
Нови Сад	Зличићева	Бетонирање плоча
Петроварадин	Златарићева 28	РИП
Нови Сад	Житни трг 5	ХНП
Нови Сад	Житни трг 5	ХВС
Нови Сад	Живојина Ђулума 72	ХНП
Нови Сад	Живка Радовановића 3	ХНП
Нови Сад	Железнички парк	НРИП, ХНШ
Нови Сад	Железничка колонија 17	БП
Нови Сад	Железничка 7	НСШ
Нови Сад	Жарка Зрењанина 2	ХНШ
Нови Сад	Епископа Висариона 7	ХНП
Нови Сад	Епископа Висариона 7	РИП
Нови Сад	Епископа Висариона 5-7	ХНП
Нови Сад	Ђуле Молнара 6	ХНВС
Нови Сад	Ђуле Молнара 6	РИП
Нови Сад	Ђорђа Табаковића 28	ХНМ
Нови Сад	Ђорђа Табаковића 28	ВПС
Нови Сад	Ђорђа Кодера Марковића 18	ВПС
Нови Сад	Ђорђа Никшића Јохана 14	ХНШ
Нови Сад	Булевар Патријарха Павла 3	ХНШ
Нови Сад	Ђорђа Никшића Јохана 14	РИП
Нови Сад	Ђорђа Никшића Јохана 14	ХНШ
Нови Сад	Димитрија Бугарског 24Б	ХНП
Нови Сад	Димитрија Аврамовића 9-11	ХНШ
Ветерник	Девет Југовића 7	НРИП
Нови Сад	Грчкошколска 9	ХНП
Нови Сад	Гагаринова 6А	РИП
Сремска Каменица	Гаврила Принципа 38-40	ХНШ
Футог	Вука Караџића 2	ХНП
Нови Сад	Вука Караџића (Ватрогасци)	ХНП (у дворишту)
Нови Сад	Војвођанска 3	НРИП
Нови Сад	Војвођанска 3	СШ

Нови Сад	Војвођанска 3	СШ
Сремска Каменица	Војводе Путника 79	БП
Нови Сад	Војводе Мишића 1	ХНС
Нови Сад	Војводе Книћанина 22	РИП
Петроварадин	Владимира Гортана 1А	ХНШ
Нови Сад	Булевар ослобођења 28	Блиндирање прикључка
Нови Сад	Булевар ослобођења 24	БП
Нови Сад	Булевар ослобођења 24	РИП
Нови Сад	Булевар ослобођења 20	ХНП
Нови Сад	Булевар ослобођења 20	Бетонирање
Нови Сад	Булевар кнеза Милоша 18	РИП
Нови Сад	Булевар војводе Степе 117	БП
Нови Сад	Булевар цара Лазара преко пута 30А	БП
Нови Сад	Булевар ослобођења 71	РИП
Нови Сад	Булевар ослобођења 30Б	БП
Нови Сад	Булевар ослобођења 20	НСШ
Нови Сад	Булевар Михајла Пупина 16	ХНС
Нови Сад	Булевар Михајла Пупина 14	НСР
Нови Сад	Булевар краља Петра I 21	РИП
Нови Сад	Булевар Јована Дучића 6	БП

Скраћеница за врсту рада	Значење скраћенице
ХНМ	Хаварија на канализационој мрежи
ХНП	Хаварија на канализационом прикључку
ХНШ	Хаварија на канализационом шахту
ХНС	Хаварија на телу сливника
РИП	Замена рама и поклопца на канализационом шахту
СШ	Замена сливничке решетке
БП	Изношење бетонске плоче
НРИП	Нивелисање рама и поклопца на канализационом шахту
НСР	Нивелисање сливничке решетке
ВПС	Враћање раскопане површине у првобитно стање

Директор
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад



Урош Лончар

Март, 2025. године
